


□ 除染実施箇所										
番号	地表面付近		増減	地表50cm高		増減	地表100cm高		増減	地表状態
	除染	除染後		除染	除染後		除染	除染後		
56	0.28	0.08	-0.20	0.26	0.09	-0.17	0.25	0.08	-0.17	±
57	0.20	0.12	-0.08	0.21	0.11	-0.10	0.22	0.09	-0.13	±
58	0.21	0.14	-0.07	0.22	0.12	-0.10	0.22	0.12	-0.10	±
67	0.28	0.10	-0.18	0.27	0.08	-0.19	0.25	0.08	-0.17	±
68	0.25	0.08	-0.17	0.23	0.09	-0.14	0.24	0.07	-0.17	±
69	0.24	0.13	-0.11	0.23	0.11	-0.12	0.23	0.10	-0.13	±
81	0.27	0.09	-0.18	0.25	0.10	-0.15	0.25	0.08	-0.17	±
82	0.29	0.10	-0.19	0.25	0.07	-0.18	0.23	0.07	-0.16	±
83	0.23	0.10	-0.13	0.22	0.11	-0.11	0.22	0.08	-0.14	±
84	0.23	0.12	-0.11	0.22	0.12	-0.10	0.22	0.10	-0.12	±
96	0.27	0.09	-0.18	0.26	0.10	-0.16	0.26	0.10	-0.16	±
97	0.28	0.09	-0.19	0.25	0.10	-0.15	0.26	0.08	-0.18	±
98	0.27	0.10	-0.17	0.23	0.09	-0.14	0.24	0.08	-0.16	±
99	0.25	0.13	-0.12	0.23	0.13	-0.10	0.23	0.11	-0.12	±
100	0.25	0.12	-0.13	0.20	0.10	-0.10	0.24	0.09	-0.15	±
107	0.24	0.10	-0.14	0.23	0.12	-0.11	0.24	0.08	-0.16	±
108	0.24	0.09	-0.15	0.22	0.09	-0.13	0.22	0.08	-0.14	±
109	0.26	0.11	-0.15	0.26	0.09	-0.17	0.24	0.09	-0.15	±
110	0.28	0.10	-0.18	0.26	0.10	-0.16	0.26	0.09	-0.17	±
111	0.23	0.12	-0.11	0.22	0.11	-0.11	0.22	0.09	-0.13	±
112	0.25	0.11	-0.14	0.24	0.10	-0.14	0.24	0.10	-0.14	±
113	0.20	0.12	-0.08	0.19	0.10	-0.09	0.19	0.11	-0.08	±
114	0.20	0.10	-0.10	0.20	0.11	-0.09	0.19	0.11	-0.08	±
117	0.24	0.12	-0.12	0.22	0.10	-0.12	0.22	0.08	-0.14	±
118	0.26	0.10	-0.16	0.24	0.12	-0.12	0.25	0.11	-0.14	±
119	0.24	0.10	-0.14	0.22	0.11	-0.11	0.24	0.08	-0.16	±
120	0.25	0.10	-0.15	0.24	0.10	-0.14	0.25	0.09	-0.16	±
121	0.31	0.11	-0.20	0.27	0.12	-0.15	0.27	0.08	-0.19	±
122	0.23	0.10	-0.13	0.22	0.10	-0.12	0.20	0.10	-0.10	±
124	0.26	0.12	-0.14	0.25	0.09	-0.16	0.24	0.09	-0.15	±
125	0.24	0.12	-0.12	0.22	0.09	-0.13	0.22	0.10	-0.12	±
126	0.27	0.12	-0.15	0.25	0.13	-0.12	0.25	0.10	-0.15	±
127	0.26	0.15	-0.11	0.24	0.13	-0.11	0.25	0.10	-0.15	±
128	0.27	0.10	-0.17	0.25	0.11	-0.14	0.24	0.09	-0.15	±
平均	0.25	0.11	-0.14	0.23	0.10	-0.13	0.24	0.09	-0.15	

○高崎中学校 除染事後 詳細測定調査

除染前測定日	平成24年7月4日	平均空間線量率 (50cm高)	0.15 $\mu$ Sv/h
除染後測定日	平成24年12月7日	平均空間線量率 (地表面)	0.17 $\mu$ Sv/h
測定地点数	44地点	測定方法	特措法及び除染関係ガイドラインに基づき、地上高50cmで測定
測定機器	シンチレーション式サーベイメータ TCS-172 (日立アロカメディカル)		
測定者	つば市放射線対策室		

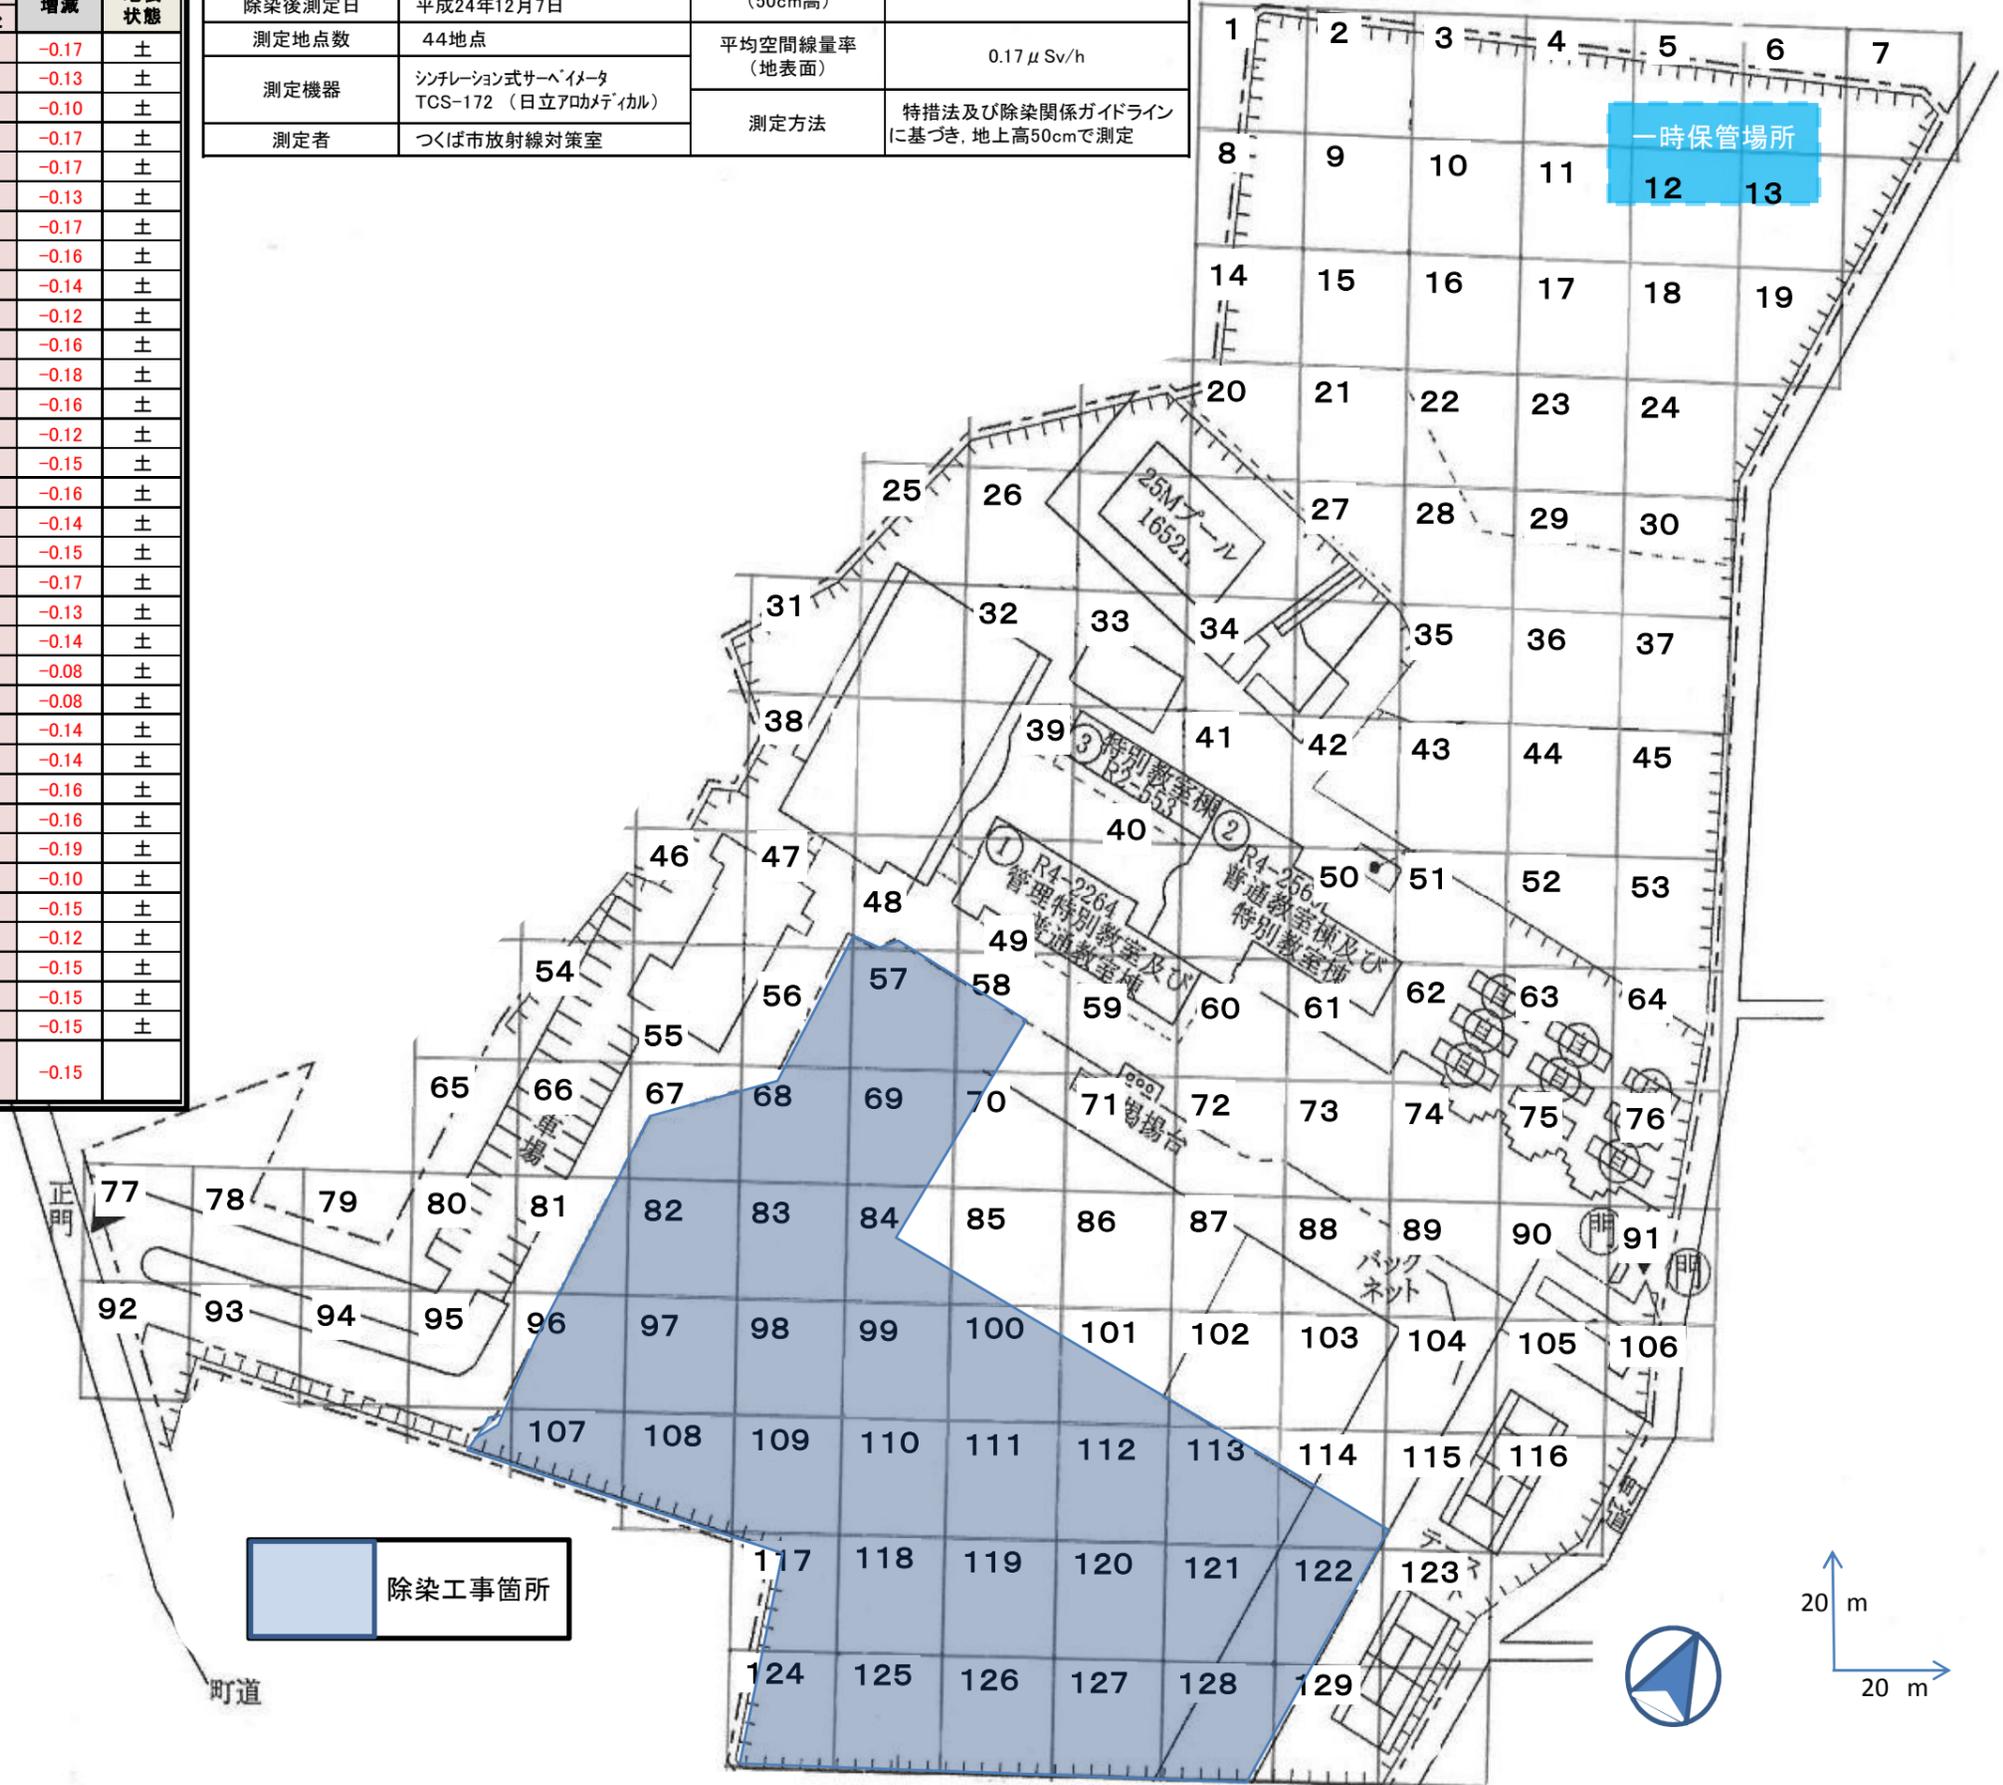

□ 敷地全体

番号	地表面付近			地表50cm高			地表100cm高			地表状態	備考	除染実施
	7月4日	12月7日	増減	7月4日	12月7日	増減	7月4日	12月7日	増減			
	1	0.25	0.20	-0.05	0.23	0.23	0.00	0.21	0.22			
2	0.18	0.22	0.04	0.21	0.22	0.01	0.20	0.21	0.01	芝	草地	
3	0.23	0.25	0.02	0.22	0.22	0.00	0.22	0.20	-0.02	芝	草地	
4	0.23	0.24	0.01	0.22	0.20	-0.02	0.21	0.17	-0.04	芝	草地	
5	0.32	0.11	-0.21	0.29	0.11	-0.18	0.26	0.11	-0.15	土	埋設場所	
6	0.25	0.10	-0.15	0.23	0.11	-0.12	0.22	0.09	-0.13	土	埋設場所	
7	0.23	0.21	-0.02	0.22	0.20	-0.02	0.18	0.14	-0.04	土	草地	
8	0.23	0.23	0.00	0.22	0.21	-0.01	0.20	0.19	-0.01	土	草地	
9	0.19	0.22	0.03	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	土	グラウンド	
10	0.16	0.18	0.02	0.14	0.17	0.03	0.15	0.17	0.02	土	グラウンド	
11	0.12	0.12	0.00	0.11	0.11	0.00	0.10	0.11	0.01	土	埋設場所	
12	0.24	0.10	-0.14	0.22	0.10	-0.12	0.21	0.09	-0.12	土	埋設場所	
13	0.21	0.21	0.00	0.20	0.20	0.00	0.14	0.14	0.00	土	草地	
14	0.23	0.20	-0.03	0.23	0.19	-0.04	0.22	0.18	-0.04	土	草地	
15	0.18	0.15	-0.03	0.16	0.18	0.02	0.16	0.17	0.01	土	グラウンド	
16	0.16	0.19	0.03	0.16	0.19	0.03	0.15	0.18	0.03	土	グラウンド	
17	0.14	0.13	-0.01	0.12	0.12	0.00	0.13	0.13	0.00	土	グラウンド	
18	0.21	0.14	-0.07	0.22	0.15	-0.07	0.22	0.15	-0.07	土	グラウンド	
19	0.25	0.25	0.00	0.21	0.21	0.00	0.17	0.17	0.00	土	草地	
20	0.22	0.22	0.00	0.20	0.20	0.00	0.19	0.18	-0.01	土	グラウンド	
21	0.23	0.23	0.00	0.22	0.20	-0.02	0.21	0.18	-0.03	土	グラウンド	
22	0.21	0.23	0.02	0.20	0.20	0.00	0.19	0.18	-0.01	土	グラウンド	
23	0.18	0.20	0.02	0.18	0.21	0.03	0.18	0.18	0.00	土	グラウンド	
24	0.21	0.20	-0.01	0.21	0.19	-0.02	0.21	0.18	-0.03	土	グラウンド	
25	0.12	0.15	0.03	0.13	0.13	0.00	0.14	0.14	0.00	土	草地	
26	0.18	0.15	-0.03	0.14	0.13	-0.01	0.14	0.14	0.00	土	草地	
27	0.21	0.22	0.01	0.19	0.20	0.01	0.17	0.18	0.01	土	草地	
28	0.21	0.22	0.01	0.20	0.19	-0.01	0.19	0.18	-0.01	土	グラウンド	
29	0.18	0.20	0.02	0.18	0.20	0.02	0.18	0.19	0.01	土	グラウンド	
30	0.21	0.24	0.03	0.21	0.20	-0.01	0.21	0.19	-0.02	土	グラウンド	
31	0.21	0.17	-0.04	0.17	0.17	0.00	0.16	0.14	-0.02	アスファルト	体育館周囲	
32	0.24	0.19	-0.05	0.19	0.18	-0.01	0.17	0.15	-0.02	土	草地	
33	0.24	0.28	0.04	0.19	0.18	-0.01	0.17	0.17	0.00	土	校舎周囲	
34	0.22	0.20	-0.02	0.18	0.16	-0.02	0.17	0.13	-0.04	アスファルト	草地	
35	0.17	0.21	0.04	0.17	0.19	0.02	0.15	0.17	0.02	土	グラウンド	
36	0.24	0.20	-0.04	0.22	0.19	-0.03	0.20	0.16	-0.04	土	テニスコート	
37	0.23	0.24	0.01	0.22	0.22	0.00	0.19	0.18	-0.01	土	グラウンド	
38	0.21	0.21	0.00	0.20	0.17	-0.03	0.18	0.15	-0.03	アスファルト	体育館周囲	
39	0.25	0.21	-0.04	0.21	0.18	-0.03	0.17	0.16	-0.01	タイル	体育館周囲	
40	0.24	0.23	-0.01	0.20	0.20	0.00	0.19	0.18	-0.01	タイル	校舎周囲	
41	0.23	0.25	0.02	0.22	0.21	-0.01	0.19	0.18	-0.01	土	草地	
42	0.24	0.22	-0.02	0.22	0.21	-0.01	0.21	0.20	-0.01	土	校舎周囲	
43	0.17	0.14	-0.03	0.16	0.15	-0.01	0.16	0.15	-0.01	土	テニスコート	
44	0.24	0.20	-0.04	0.19	0.14	-0.05	0.18	0.15	-0.03	土	テニスコート	
45	0.19	0.21	0.02	0.16	0.18	0.02	0.16	0.18	0.02	土	草地	
46	0.20	0.21	0.01	0.19	0.15	-0.04	0.17	0.15	-0.02	アスファルト	体育館周囲	
47	0.22	0.18	-0.04	0.20	0.16	-0.04	0.17	0.15	-0.02	アスファルト	体育館周囲	
48	0.20	0.20	0.00	0.17	0.18	0.01	0.17	0.15	-0.02	アスファルト	通路	
49	0.24	0.20	-0.04	0.18	0.16	-0.02	0.17	0.14	-0.03	タイル	通路	
50	0.24	0.19	-0.05	0.22	0.19	-0.03	0.21	0.18	-0.03	土	校舎周囲	
51	0.20	0.17	-0.03	0.19	0.17	-0.02	0.17	0.14	-0.03	アスファルト	校舎周囲	
52	0.15	0.16	0.01	0.17	0.15	-0.02	0.17	0.15	-0.02	アスファルト	駐輪場	
53	0.24	0.20	-0.04	0.24	0.20	-0.04	0.22	0.18	-0.04	土	草地	
54	0.19	0.20	0.01	0.17	0.16	-0.01	0.16	0.15	-0.01	アスファルト	駐車場	
55	0.19	0.20	0.01	0.15	0.15	0.00	0.14	0.14	0.00	アスファルト	駐車場	
56	0.28	0.08	-0.20	0.26	0.09	-0.17	0.25	0.08	-0.17	土	グラウンド	○
57	0.20	0.12	-0.08	0.21	0.11	-0.10	0.22	0.09	-0.13	土	グラウンド	○
58	0.21	0.14	-0.07	0.22	0.12	-0.10	0.22	0.12	-0.10	土	グラウンド	○
59	0.16	0.14	-0.02	0.15	0.12	-0.03	0.14	0.12	-0.02	タイル	通路	
60	0.14	0.14	0.00	0.14	0.13	-0.01	0.16	0.12	-0.04	タイル	通路	
61	0.14	0.17	0.03	0.14	0.15	0.01	0.14	0.15	0.01	アスファルト	校舎周囲	
62	0.13	0.12	-0.01	0.13	0.10	-0.03	0.13	0.12	-0.01	アスファルト	駐輪場	
63	0.14	0.15	0.01	0.15	0.16	0.01	0.13	0.13	0.00	アスファルト	駐輪場	
64	0.16	0.16	0.00	0.16	0.15	-0.01	0.16	0.12	-0.04	アスファルト	駐輪場	


番号	地表面付近			地表50cm高			地表100cm高			地表状態	備考	除染実施
	7月4日	12月7日	増減	7月4日	12月7日	増減	7月4日	12月7日	増減			
	65	0.16	0.19	0.03	0.16	0.15	-0.01	0.17	0.13			
66	0.15	0.13	-0.02	0.15	0.13	-0.02	0.14	0.11	-0.03	アスファルト	駐車場	
67	0.28	0.10	-0.18	0.27	0.09	-0.18	0.25	0.08	-0.17	土	グラウンド	○
68	0.25	0.08	-0.17	0.23	0.09	-0.14	0.24	0.07	-0.17	土	グラウンド	○
69	0.24	0.13	-0.11	0.23	0.11	-0.12	0.23	0.10	-0.13	土	グラウンド	○
70	0.19	0.17	-0.02	0.19	0.16	-0.03	0.20	0.15	-0.05	土	グラウンド	
71	0.20	0.19	-0.01	0.19	0.18	-0.01	0.21	0.17	-0.04	土	グラウンド	
72	0.29	0.25	-0.04	0.25	0.20	-0.05	0.21	0.19	-0.02	芝	グラウンド	
73	0.22	0.18	-0.04	0.20	0.16	-0.04	0.19	0.14	-0.05	アスファルト	通路	
74	0.17	0.19	0.02	0.15	0.16	0.01	0.15	0.14	-0.01	アスファルト	通路	
75	0.15	0.13	-0.02	0.13	0.11	-0.02	0.13	0.12	-0.01	アスファルト	駐輪場	
76	0.15	0.16	0.01	0.13	0.15	0.02	0.13	0.14	0.01	アスファルト	駐輪場	
77	0.17	0.18	0.01	0.16	0.14	-0.02	0.14	0.13	-0.01	タイル	通路	
78	0.22	0.20	-0.02	0.18	0.16	-0.02	0.17	0.14	-0.03	アスファルト	通路	
79	0.21	0.20	-0.01	0.19	0.17	-0.02	0.19	0.16	-0.03	アスファルト	通路	
80	0.19	0.18	-0.01	0.17	0.13	-0.04	0.15	0.16	0.01	アスファルト	駐車場	
81	0.27	0.09	-0.18	0.25	0.10	-0.15	0.25	0.08	-0.17	土	グラウンド	○
82	0.29	0.10	-0.19	0.25	0.09	-0.16	0.23	0.07	-0.16	土	グラウンド	○
83	0.23	0.10	-0.13	0.22	0.11	-0.11	0.22	0.08	-0.14	土	グラウンド	○
84	0.23	0.12	-0.11	0.22	0.12	-0.10	0.22	0.10	-0.12	土	グラウンド	○
85	0.22	0.21	-0.01	0.20	0.17	-0.03	0.20	0.16	-0.04	土	グラウンド	
86	0.21	0.20	-0.01	0.20	0.15	-0.05	0.21	0.16	-0.05	土	グラウンド	
87	0.19	0.21	0.02	0.18	0.18	0.00	0.20	0.17	-0.03	土	グラウンド	
88	0.19	0.15	-0.04	0.19	0.15	-0.04	0.19	0.15	-0.04	土	グラウンド	
89	0.18	0.15	-0.03	0.18	0.16	-0.02	0.18	0.14	-0.04	土	グラウンド	
90	0.25	0.22	-0.03	0.24	0.21	-0.03	0.20	0.19	-0.01	土	草地	
91	0.18	0.14	-0.04	0.17	0.12	-0.05	0.17	0.14	-0.03	アスファルト	通路	
92	0.18	0.15	-0.03	0.17	0.15	-0.02	0.16	0.14	-0.02	タイル	通路	
93	0.20	0.22	0.02	0.18	0.16	-0.02	0.16	0.16	0.00	アスファルト	通路	
94	0.21	0.20	-0.01	0.19	0.16	-0.03	0.17	0.15	-0.02	アスファルト	通路	
95	0.15	0.16	0.01	0.13	0.14	0.01	0.13	0.12	-0.01	アスファルト	通路	
96	0.27	0.09	-0.18	0.26	0.10	-0.16	0.26	0.10	-0.16	土	グラウンド	○
97	0.28	0.09	-0.19	0.25	0.10	-0.15	0.26	0.08	-0.18	土	グラウンド	○
98	0.27	0.10	-0.17	0.23	0.09	-0.14	0.24	0.08	-0.16	土	グラウンド	○
99	0.25	0.13	-0.12	0.23	0.13	-0.10	0.23	0.11	-0.12	土	グラウンド	○
100	0.25	0.12	-0.13	0.20	0.10	-0.10	0.24	0.09	-0.15	土	グラウンド	○
101	0.20	0.15	-0.05	0.20	0.17	-0.03	0.20	0.15	-0.05	土	グラウンド	
102	0.20	0.14	-0.06	0.19	0.15	-0.04	0.18	0.12	-0.06	土	グラウンド	
103	0.23	0.18	-0.05	0.21	0.16	-0.05	0.20	0.15	-0.05	土	グラウンド	
104	0.20	0.21	0.01	0.19	0.20	0.01	0.18	0.16	-0.02	土	グラウンド	
105	0.10	0.12	0.02	0.10	0.12	0.02	0.11	0.11	0.00	土	テニスコート	
106	0.23	0.19	-0.04	0.22	0.18	-0.04	0.20	0.16	-0.04	土	草地	

○荖崎第二小学校 除染事後 詳細測定調査

除染前測定日	平成24年6月21日	平均空間線量率 (50cm高)	0.12 $\mu$ Sv/h
除染後測定日	平成24年12月7日		
測定地点数	44地点	平均空間線量率 (地表面)	0.15 $\mu$ Sv/h
測定機器	シンチレーション式サーベイメータ TCS-172 (日立アロカメディカル)		
測定者	つくば市放射線対策室	測定方法	特措法及び除染関係ガイドラインに基づき、地上高50cmで測定

□ 敷地全体

番号	地表面付近		増減	地表50cm高		増減	地表状態	備考	除染実施
	6月21日	12月7日		6月21日	12月7日				
1	0.30	0.22	-0.08	0.25	0.17	-0.08	アスファルト	校舎裏(北)	
2	0.25	0.21	-0.04	0.22	0.15	-0.07	土	校舎裏(北)	
3	0.23	0.18	-0.05	0.20	0.15	-0.05	アスファルト	校舎裏(北)	
4	0.20	0.18	-0.02	0.19	0.16	-0.03	アスファルト	校舎裏(北)	
5	0.30	0.26	-0.04	0.25	0.20	-0.05	土	校舎裏(北)	
6	0.34	0.23	-0.11	0.25	0.17	-0.08	土	校舎裏(北)	
7	0.33	0.22	-0.11	0.25	0.17	-0.08	土	校舎裏(北)	
8	0.29	0.16	-0.13	0.17	0.14	-0.03	アスファルト	校舎裏(北)	
9	0.15	0.14	-0.01	0.14	0.11	-0.03	アスファルト	体育館周囲	
10	0.19	0.22	0.03	0.17	0.17	0.00	土	体育館周囲	
11	0.25	0.26	0.01	0.19	0.20	0.01	芝	校舎裏(西)	
12	0.26	0.26	0.00	0.22	0.21	-0.01	土	校舎裏(西)	
13	0.40	0.09	-0.31	0.35	0.08	-0.27	芝	校庭(芝)	○
14	0.30	0.08	-0.22	0.30	0.06	-0.24	芝	校庭(芝)	○
15	0.60	0.14	-0.46	0.38	0.11	-0.27	芝	校庭(芝)	○
16	0.13	0.13	0.00	0.12	0.12	0.00	アスファルト	体育館周囲	
17	0.21	0.18	-0.03	0.17	0.15	-0.02	土	体育館周囲	
18	0.26	0.24	-0.02	0.18	0.18	0.00	芝	校舎裏(西)	
19	0.18	0.18	0.00	0.16	0.14	-0.02	アスファルト	校内通路	
20	0.33	0.08	-0.25	0.30	0.07	-0.23	芝	校庭(芝)	○
21	0.38	0.09	-0.29	0.34	0.08	-0.26	芝	校庭(芝)	○
22	0.48	0.08	-0.40	0.38	0.07	-0.31	芝	校庭(芝)	○
23	0.22	0.11	-0.11	0.22	0.09	-0.13	日	グラウンド	○
24	0.32	0.11	-0.21	0.25	0.09	-0.16	土	グラウンド	○
25	0.20	0.27	0.07	0.20	0.22	0.02	土	校庭(周囲)	
26	0.24	0.22	-0.02	0.22	0.16	-0.06	土	校庭(周囲)	
27	0.19	0.08	-0.11	0.18	0.07	-0.11	土	グラウンド	○
28	0.30	0.06	-0.24	0.23	0.06	-0.17	土	グラウンド	○
29	0.30	0.06	-0.24	0.21	0.08	-0.13	土	グラウンド	○
30	0.29	0.08	-0.21	0.24	0.08	-0.16	土	グラウンド	○
31	0.28	0.10	-0.18	0.24	0.07	-0.17	土	グラウンド	○
32	0.20	0.20	0.00	0.20	0.16	-0.04	土	校庭(周囲)	
33	0.23	0.23	0.00	0.22	0.18	-0.04	土	校庭(周囲)	
34	0.28	0.22	-0.06	0.24	0.17	-0.07	土	校庭(周囲)	
35	0.20	0.09	-0.11	0.18	0.08	-0.10	土	グラウンド	○
36	0.24	0.05	-0.19	0.22	0.07	-0.15	土	グラウンド	○
37	0.21	0.06	-0.15	0.18	0.06	-0.12	土	グラウンド	○
38	0.28	0.08	-0.20	0.23	0.07	-0.16	土	グラウンド	○
39	0.35	0.12	-0.23	0.30	0.10	-0.20	土	グラウンド	○
40	0.31	0.21	-0.10	0.20	0.16	-0.04	アスファルト	校庭(周囲)	
41	0.31	0.22	-0.09	0.29	0.14	-0.15	アスファルト	校庭(周囲)	
42	0.31	0.14	-0.17	0.24	0.11	-0.13	土	グラウンド	○
43	0.26	0.09	-0.17	0.24	0.10	-0.14	土	グラウンド	○
44	0.27	0.07	-0.20	0.24	0.08	-0.16	土	グラウンド	○
平均	0.28	0.15	-0.13	0.23	0.12	-0.11	単位: 毎時マイクロシーベルト		

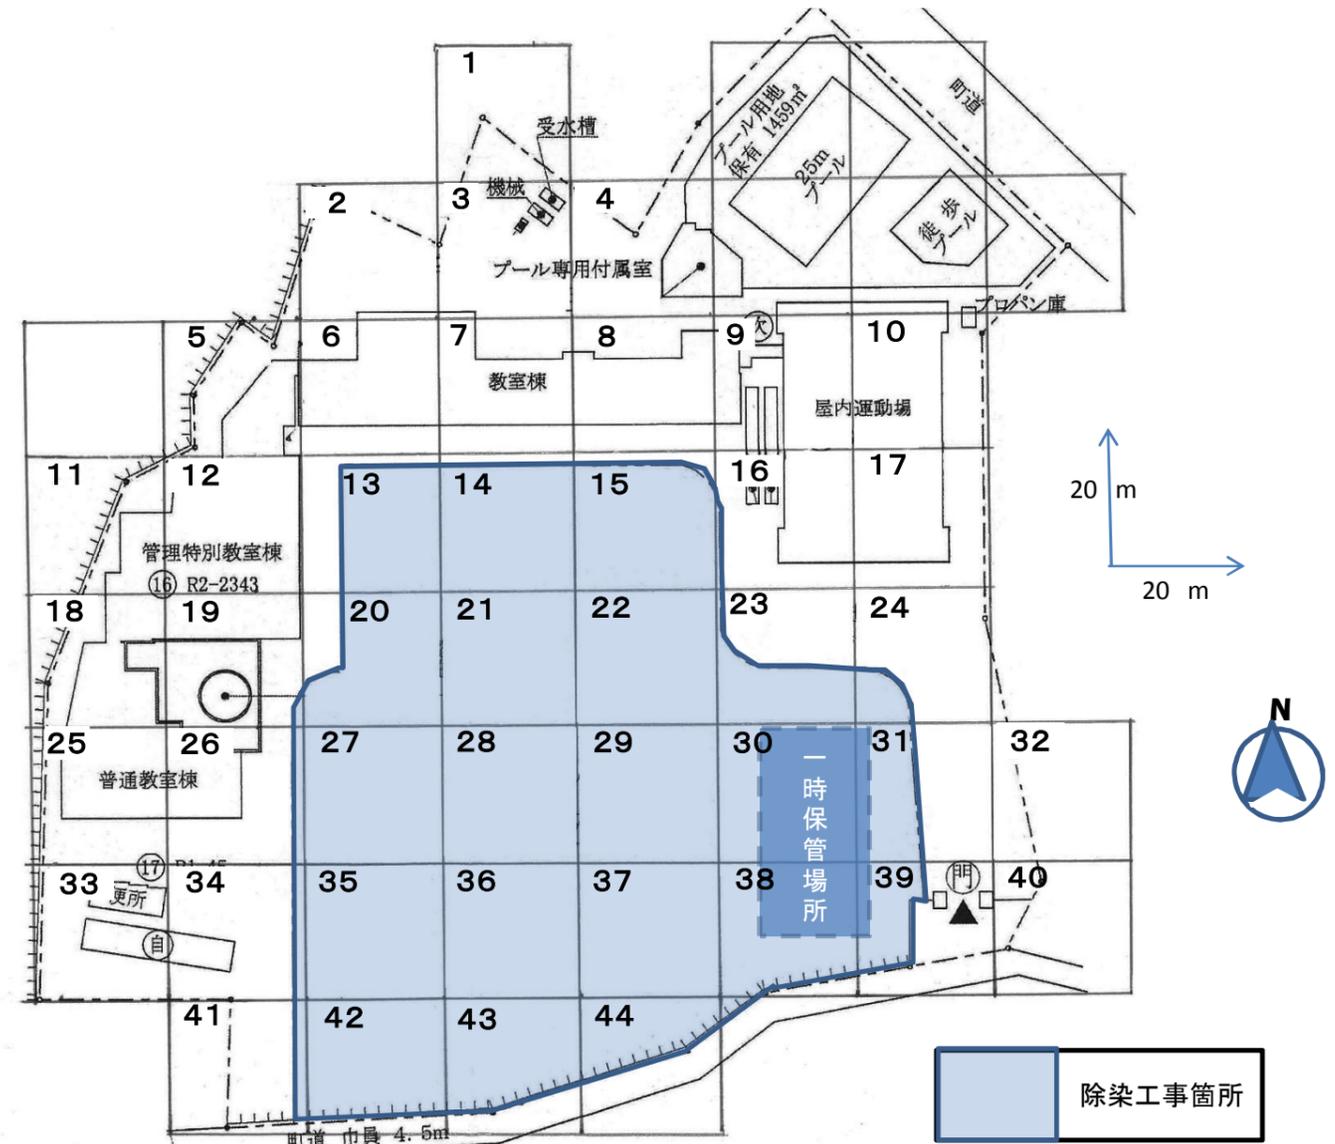

□ 除染実施箇所

番号	地表面付近		増減	地表50cm高		増減	地表状態	備考
	除染前	除染後		除染前	除染後			
13	0.40	0.09	-0.31	0.35	0.08	-0.27	芝	校庭(芝)
14	0.30	0.08	-0.22	0.30	0.06	-0.24	芝	校庭(芝)
15	0.60	0.14	-0.46	0.38	0.11	-0.27	芝	校庭(芝)
20	0.33	0.08	-0.25	0.30	0.07	-0.23	芝	校庭(芝)
21	0.38	0.09	-0.29	0.34	0.08	-0.26	芝	校庭(芝)
22	0.48	0.08	-0.40	0.38	0.07	-0.31	芝	校庭(芝)
23	0.22	0.11	-0.11	0.22	0.09	-0.13	日	グラウンド
24	0.32	0.11	-0.21	0.25	0.09	-0.16	土	グラウンド
27	0.19	0.08	-0.11	0.18	0.07	-0.11	土	グラウンド
28	0.30	0.06	-0.24	0.23	0.06	-0.17	土	グラウンド
29	0.30	0.06	-0.24	0.21	0.08	-0.13	土	グラウンド
30	0.29	0.08	-0.21	0.24	0.08	-0.16	土	グラウンド
31	0.28	0.10	-0.18	0.24	0.07	-0.17	土	グラウンド
35	0.20	0.09	-0.11	0.18	0.08	-0.10	土	グラウンド
36	0.24	0.05	-0.19	0.22	0.07	-0.15	土	グラウンド
37	0.21	0.06	-0.15	0.18	0.06	-0.13	土	グラウンド
38	0.28	0.08	-0.20	0.23	0.07	-0.16	土	グラウンド
39	0.35	0.12	-0.23	0.30	0.10	-0.20	土	グラウンド
42	0.31	0.14	-0.17	0.24	0.11	-0.10	土	グラウンド
43	0.26	0.09	-0.17	0.24	0.10	-0.14	土	グラウンド
44	0.27	0.07	-0.20	0.24	0.08	-0.16	土	グラウンド
平均	0.31	0.09	-0.22	0.26	0.08	-0.18	単位: 毎時マイクロシーベルト	
