

工事概要書

工 事 件 名 7-8 市単旧上郷高校解体工事

工 事 場 所 茨城県つくば市上郷2494 番地 1 ほか

工 期 自) 令和7年10月 4日 ～ 至) 令和 8 年11月30日

作 業 時 間 帯 8:00より ～ 17:00まで
(場合により残業を行います、音の大きい作業は17:00までとします。)

発 注 者 つくば市長

請 負 者 株式会社 田崎 [担当 中山 昇
田中 誠]


問い合わせ先 (電話番号)
TEL 029-893-4677

主 な 工 事 内 容

解体工事一式・本館、特別教室棟、体育館、合宿所、プール棟、運動部室、旧体育館、格技場、その他付属建築物の解体・建築設備、工作物、運動場、庭園、駐車場、植栽等の撤去
延べ面積：11,312.9㎡
敷地面積：70,089.0㎡

構造規模

本 館	鉄筋コンクリート造 4 階建て	延べ面積 3,155㎡
特別教室棟	鉄筋コンクリート造 4 階建て	延べ面積 2,674㎡
体 育 館	鉄筋コンクリート造 2 階建て	延べ面積 1,560㎡

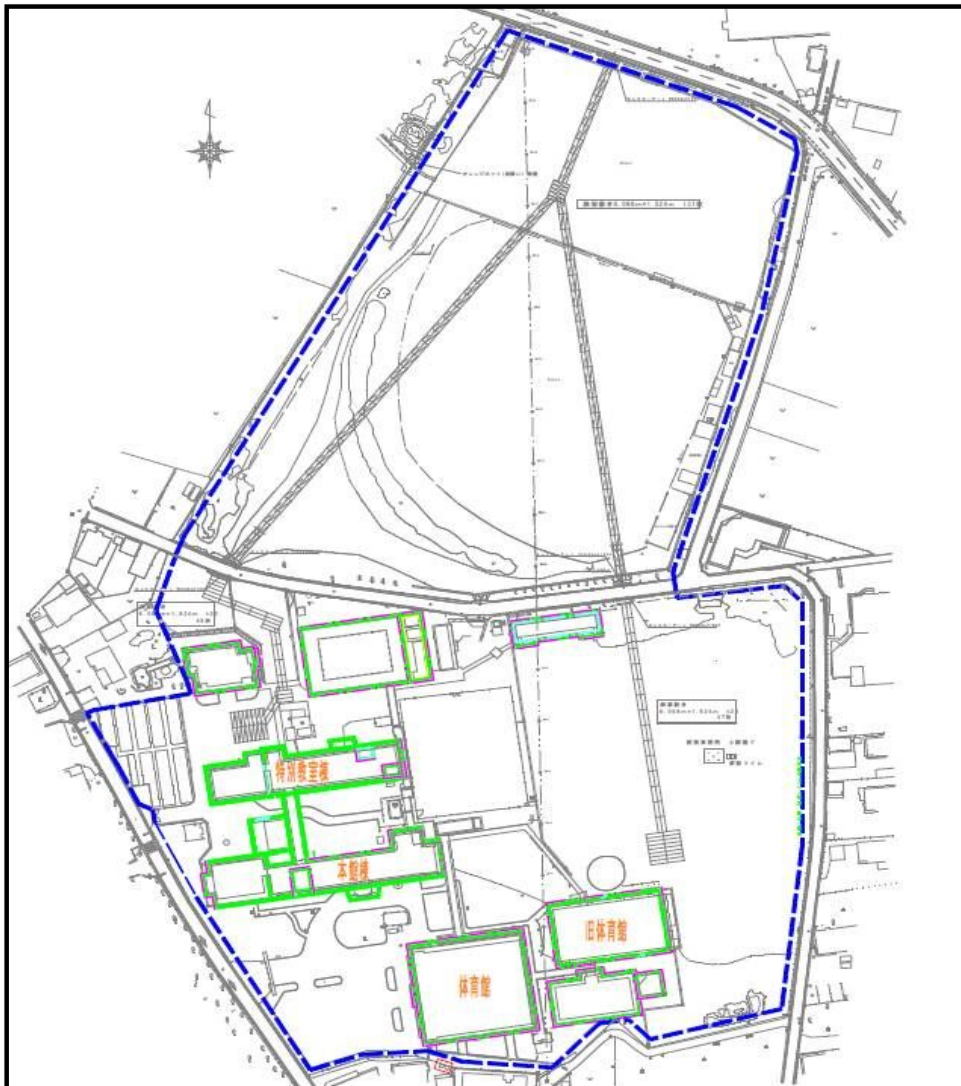

实 施 工 程 表

株式会社 田崎

工事場所 茨城県つくば市上郷2494 番地1ほか

自：令和7年10月 4日
至：令和8年11月30日

発注者 つくば市


受注者

現場代理人 田中 誠

[illegible]


工事名 7-8市単旧上郷高校解体工事
工事場所 茨城県つくば市上郷2494 番地 1 ほか

配置図

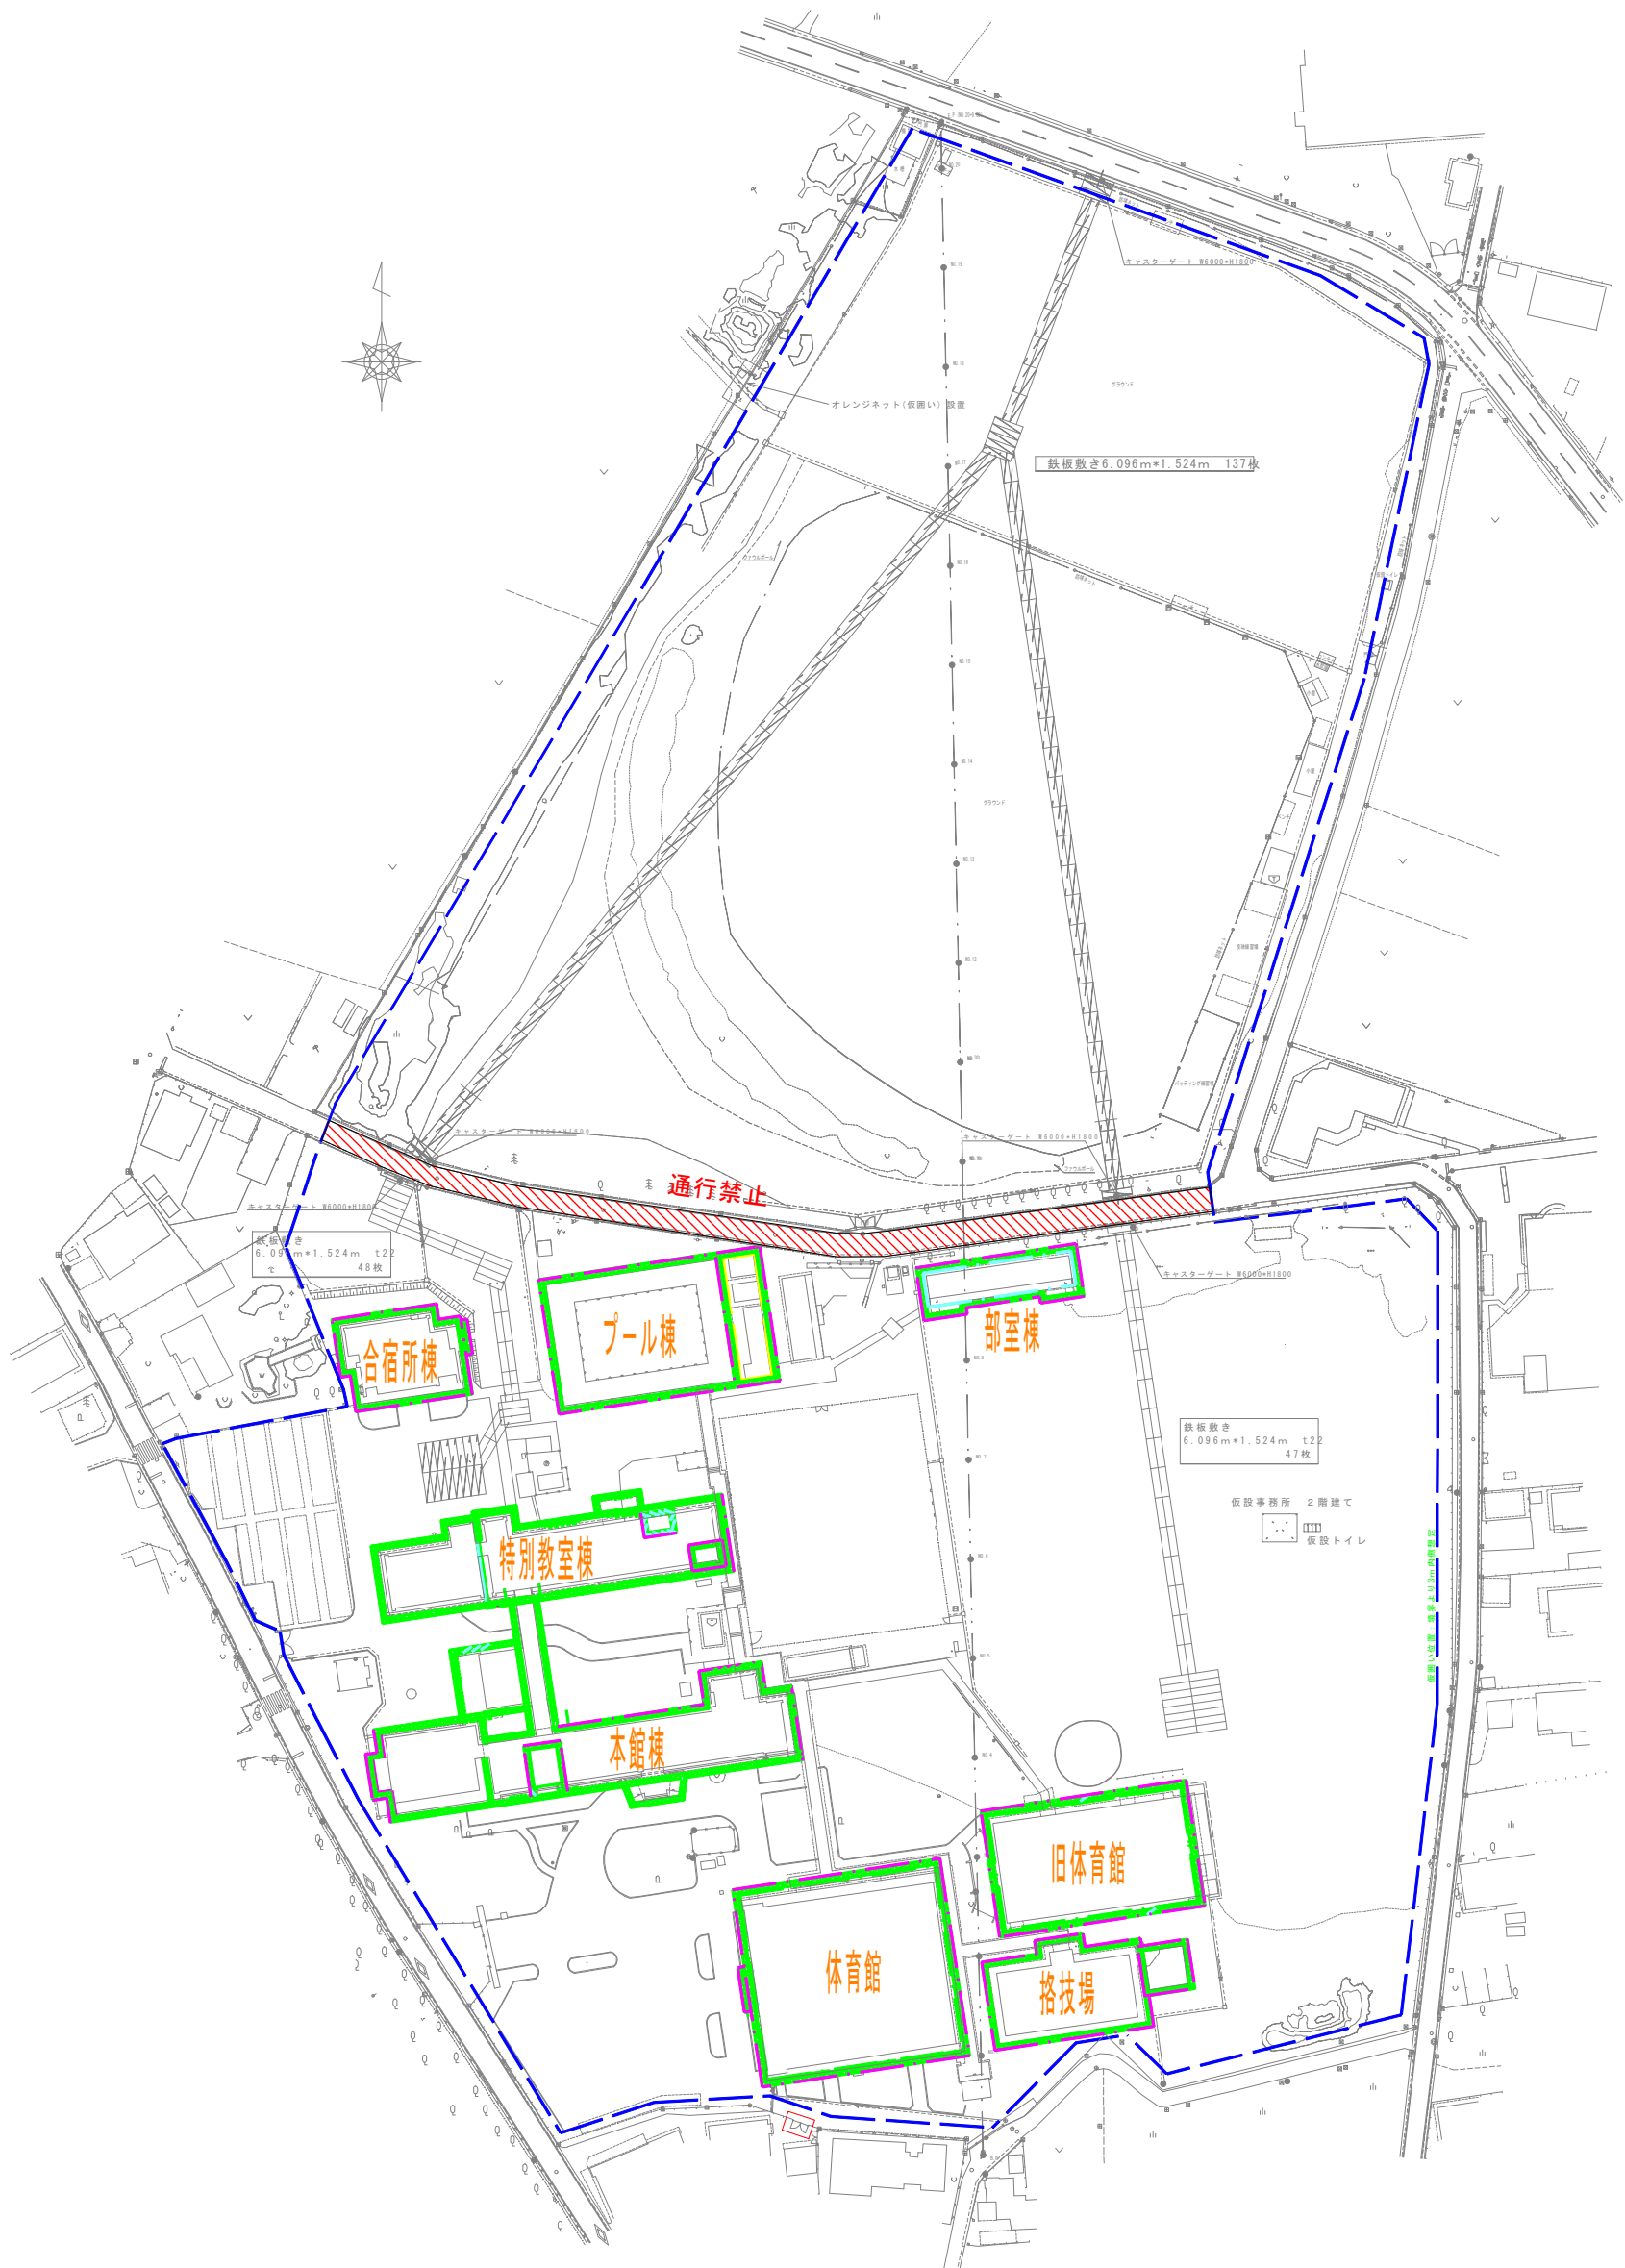

7-8市単旧上郷高校解体工事

工事車両搬入路計画

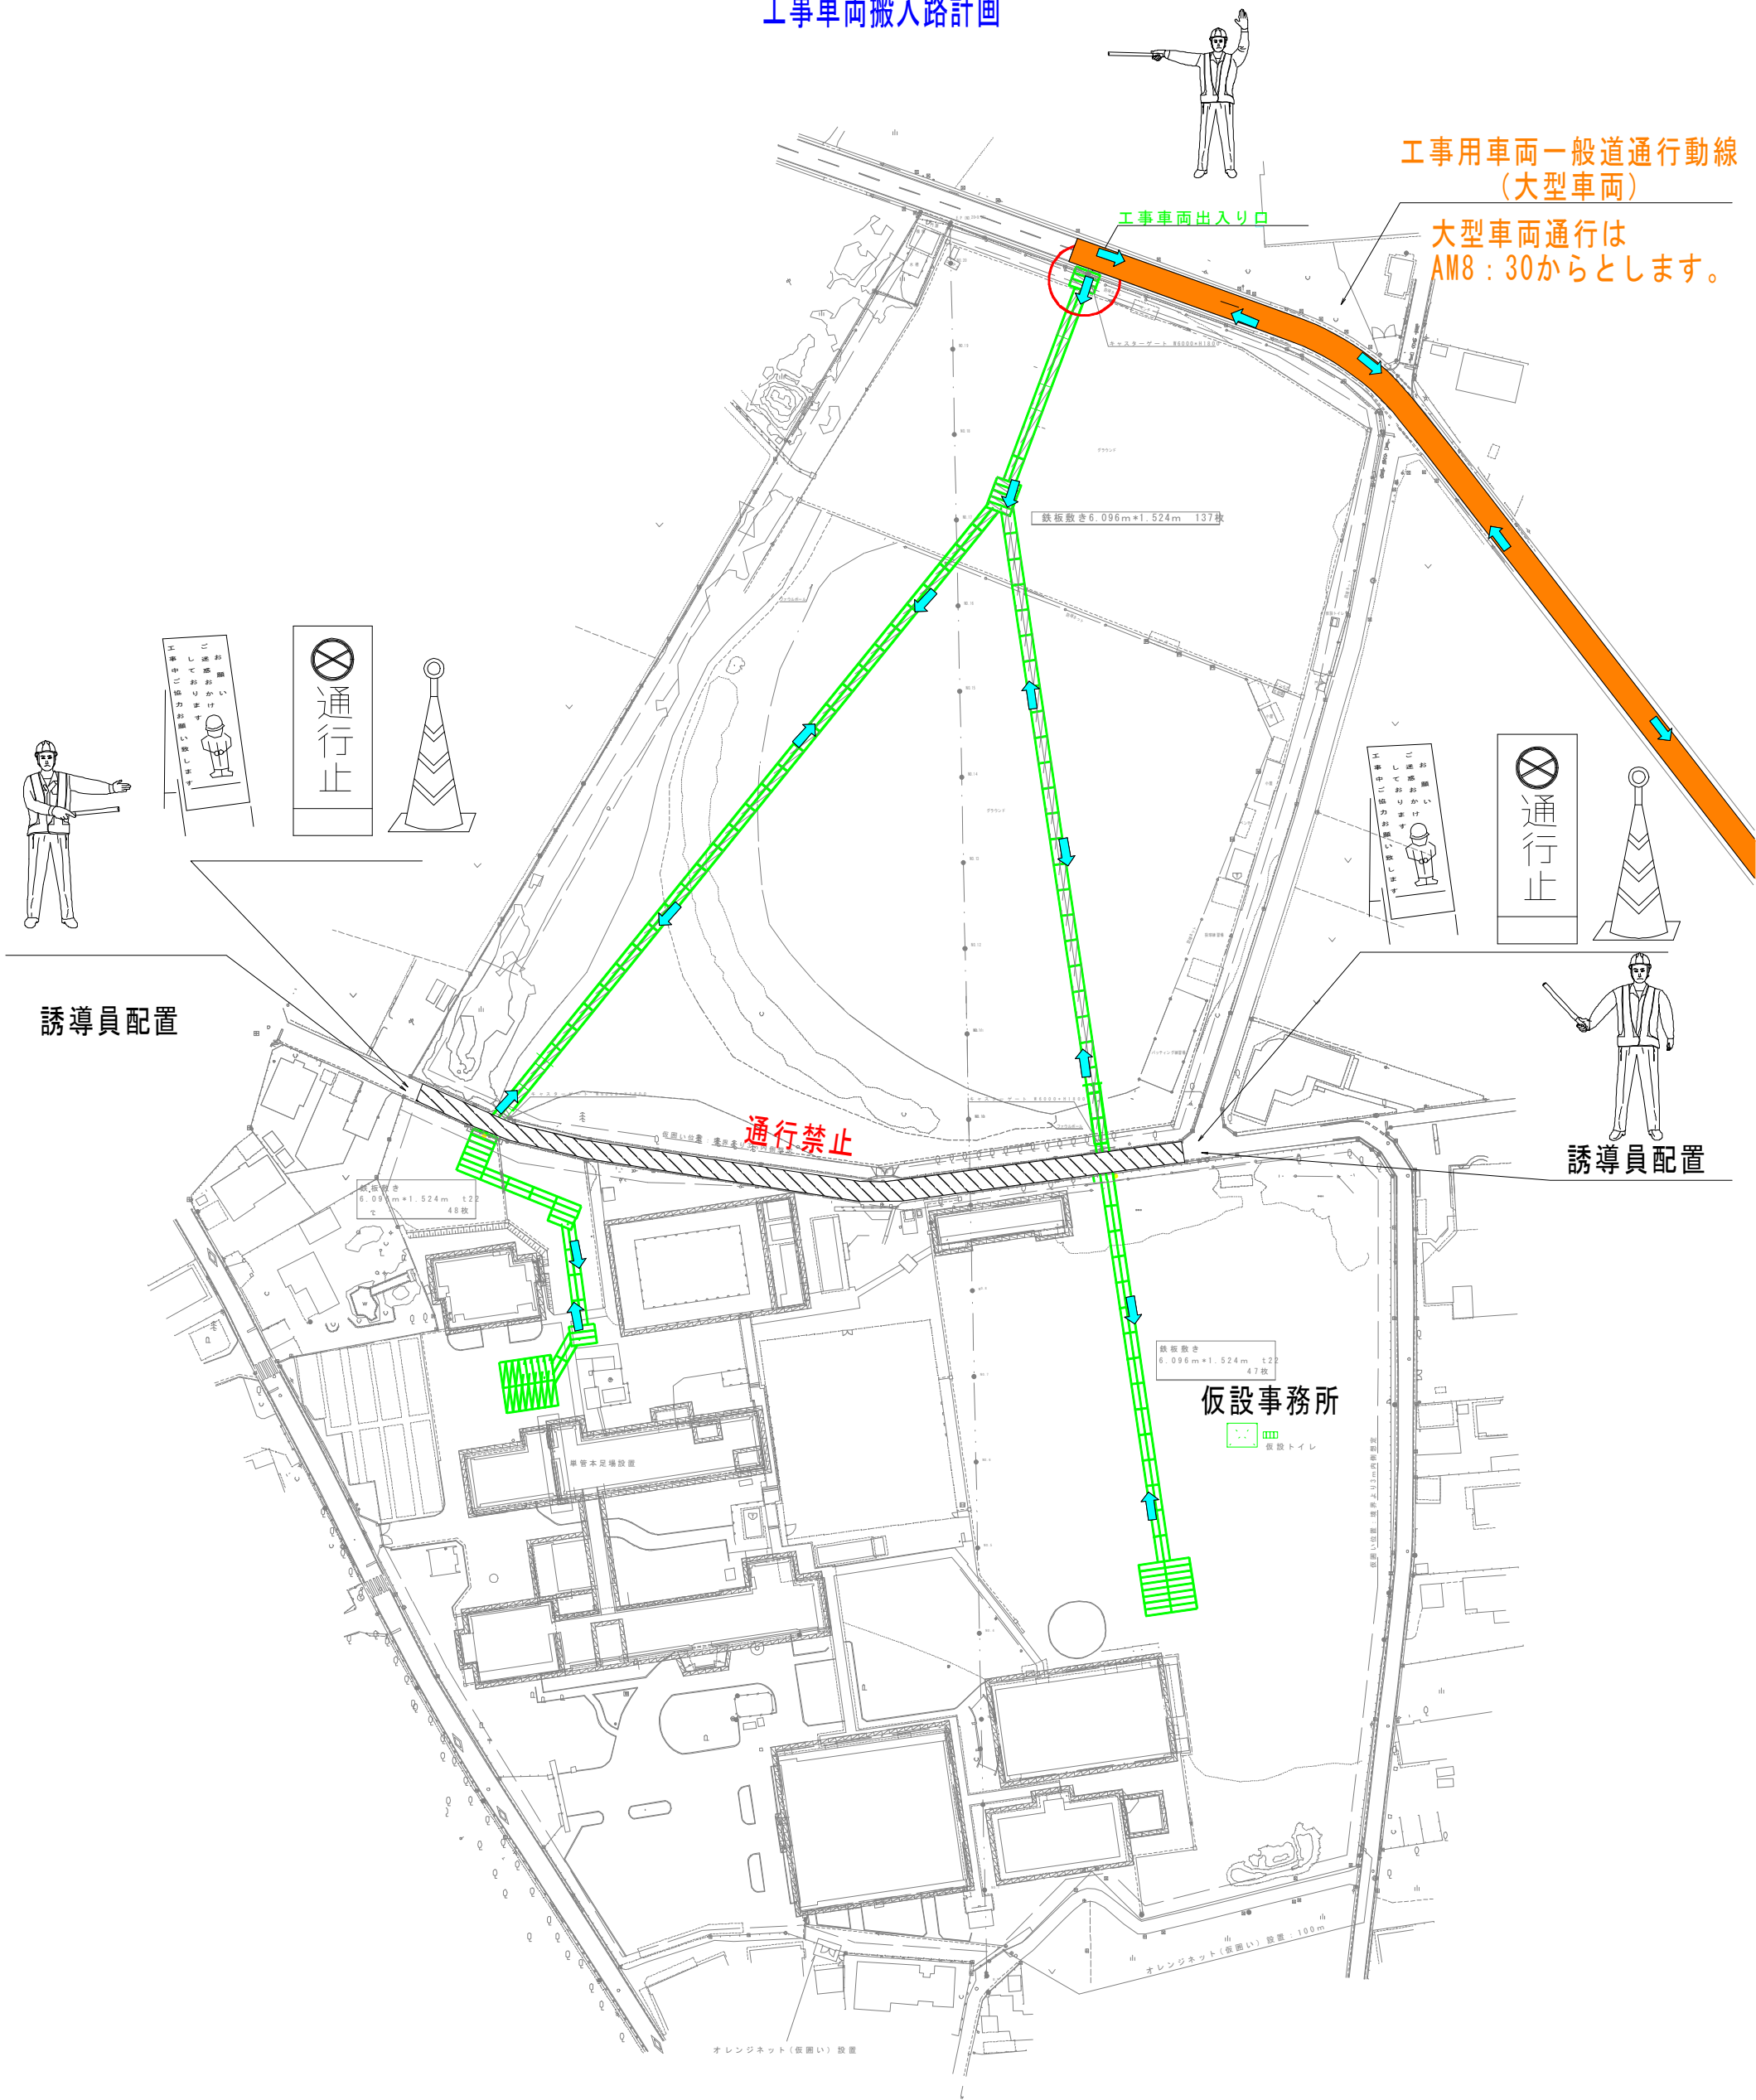

騒音対策について

仮囲いの設置（解体現場全体）

仮囲いを、土地の境界線内側に立て、児童 第三者が解体現場に誤って侵入しない様安全対策を行います。又、騒音の抑制や粉塵の飛散を防止します。

仮囲い 鉄板製 H=2.0m 校舎側 826m
第二グラウンド側 694m



仮囲い 鉄板製 H=2.0m



建築物周りへ防音パネルの設置

建築物周りに足場を設置し、外側に防音パネル設けます。
防音パネルを使用し、粉塵と音の両方を抑え周辺住民様の迷惑に成らないよう対策いたします。

低騒音型重機の積極的な使用

低騒音型重機（圧砕機等）は、通常の重機と比べて音の発生が抑えられており、積極的に使用します。

重機の稼働音を抑えるには、エンジンの回転数を適切に設定
通常の作業より低い回転数で稼働させることで、騒音が減少し、
工事の進行と安全性を確保しながらの作業を行います。

作業中、待機している建設作業機械は、エンジンを止めるよう心掛けます。

防音パネル アルミ製 13022㎡



凡 例

--- 仮囲い

■ 防音パネル
