つくば市　橋梁長寿命化修繕計画

令和8年5月改定

つくば市　建設部　道路整備課

目　　次

１．長寿命化修繕計画の目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

６．長寿命化修繕計画による効果

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

（備考）
令和2年 3月19日　策定
令和4年10月26日　改定
（老朽化対策における基本方針、新技術活用に関する基本方針、集約化・撤去に関する方針を追記）
令和8年 2月2日　改定
（令和6年度末時点の管理橋梁数及び点検結果更新、具体的な数値目標を追記）
令和8年5月15日　改定
（令和7年度末時点の管理橋梁数及び点検結果更新）

1. 長寿命化修繕計画の目的

1）目的

つくば市が管理する橋梁は603橋あるが、その多くが高度経済成長時に建設されており、今後、老朽化が急速に進み、劣化損傷による第三者被害の危険、大規模補修や架け替えによる膨大な費用及び損傷や工事に伴う通行規制による社会的損失等が急増する事が予測される。

この事から、橋梁の維持管理コストの縮減を図るため、原則として「事後保全」型維持管理から損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う「予防保全」型維持管理への転換を図る。


各個別橋梁の補修・補強対策については、損傷が発見された橋梁を優先し、さらには、損傷の劣化速度を予測し、重大な劣化・損傷の発生から安全性が確保できるよう計画的に補修工事を行う。

これにより、定期点検を実施し、予防保全型に転換する事で、軽微な損傷であっても早期発見により、安全性を確保することができる。

2）管理橋梁の現状

現在管理する橋梁は603橋であり、このうち1976年以前に架設され、供用年数が50年以上である橋梁は全体の43 %である。

10年後、供用年数が50年以上となる橋梁の割合は83 %である。また20年後は90 %まで増加し、30年後にはほぼ全ての橋梁が供用年数50年以上となる。

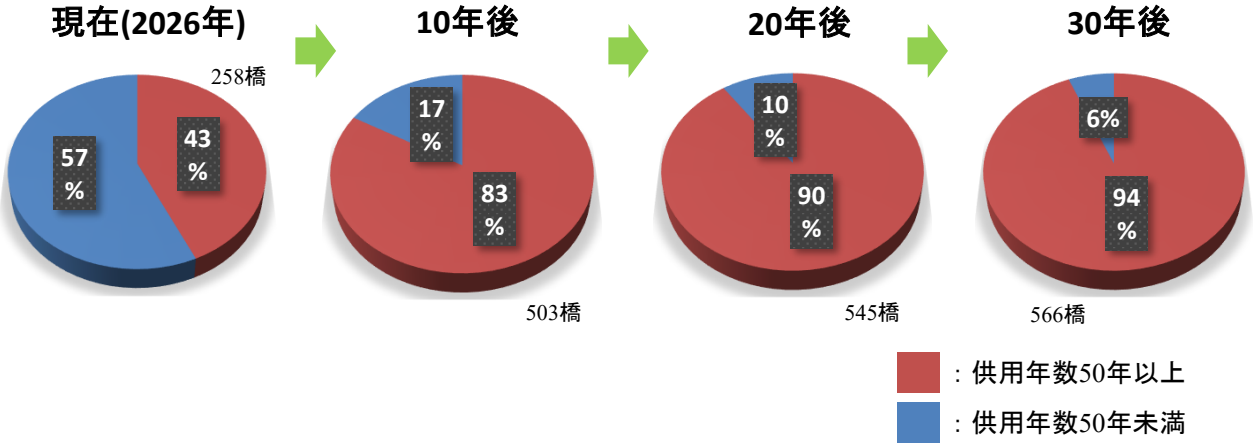

建設から50年が経過した橋梁の割合

● 管理橋梁数


15 m未満の橋梁数	462
15 m以上50 m未満の橋梁数	103
50 m以上の橋梁数	38
合　計	603


2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	1級市道	2級市道	左記以外	合計
全管理橋梁数	67	27	509	603
予防保全Ⅰ型の橋梁	2	2	50	54
予防保全Ⅱ型の橋梁	63	17	206	286
予防保全Ⅲ型の橋梁	2	0	0	2
監視型の橋梁	0	8	252	260
対症療法型の橋梁	0	0	1	1


■対象橋梁の現況

【橋長の分布】

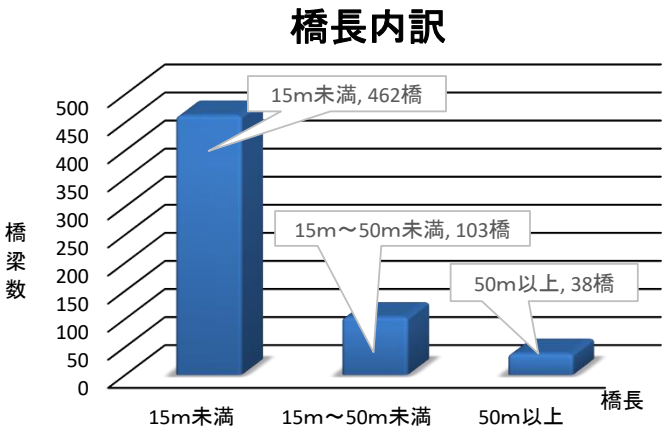

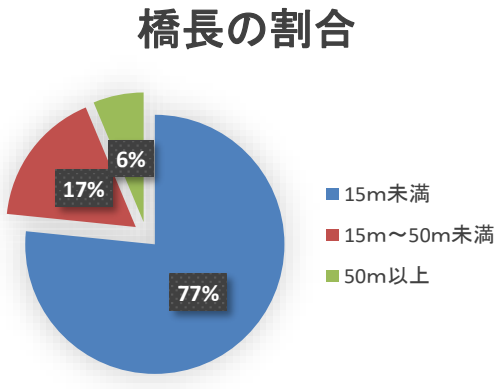

【橋の年齢分布】

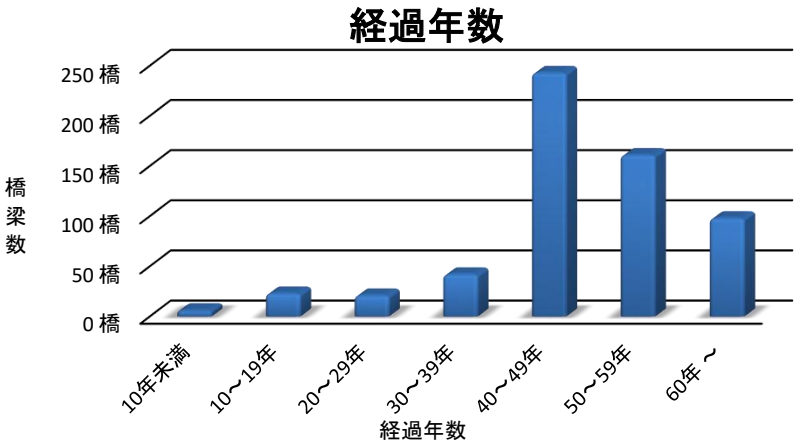

経過年数	橋梁数
10年未満	6 橋
10～19年	23 橋
20～29年	21 橋
30～39年	42 橋
40～49年	243 橋
50～59年	161 橋
60年 ～	98 橋

544橋


※経過年数不明 9橋

2026年現在

参考：架設後30年以上経過する橋梁

$$\frac{544\text{ 橋}}{603\text{ 橋}} \times 100 \fallingdotseq 90\ \%$$

【橋の構造内訳】

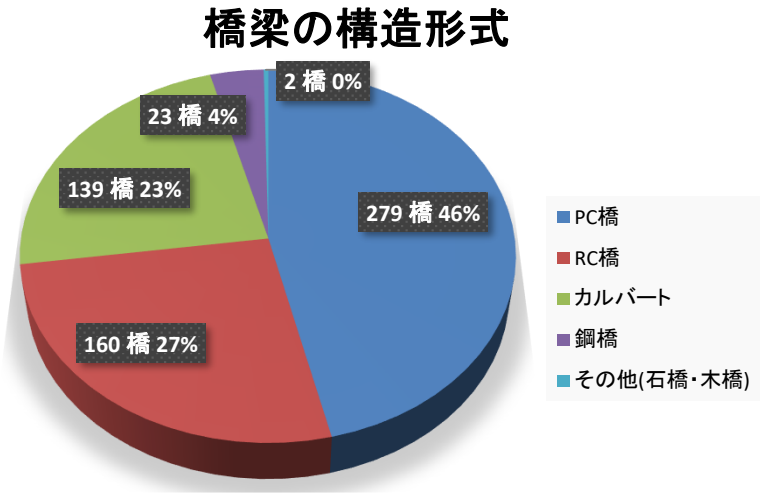

橋種	PC橋	RC橋	カルバート	鋼橋	その他(石橋・木橋)	合計
橋梁数	279 橋	160 橋	139 橋	23 橋	2 橋	603 橋
橋梁の比率	46%	27 %	23%	4 %	0%	100 %

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1）健全度の把握の基本的方針

つくば市では、「橋梁点検の手引書　令和6年7月」に基づき、5年に1回の近接目視を基本とした定期点検を実施し、橋梁の損傷状況（健全度）を把握し、今後の策定計画に反映させる。

2）日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁を良好な状態に保つため、パトロールによる日常的な維持管理を実施するとともに、清掃や土砂詰まりの除去等を行い、比較的対応が容易なものについては日常の維持作業により実施する。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

⑴老朽化対策における基本方針

つくば市が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過する橋梁が全体の約90 %を占めているため、近い将来、一斉に修繕時期を迎えることが予想される。したがって、ライフサイクルコストを考慮し、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、修繕に要するコストを縮減する。

つくば市では、今回の計画対象橋梁603橋において、橋梁の諸元(橋長、幅員、橋種等)や環境、重要度を考慮した以下の管理区分を設定し、橋の長寿命化を図るとともに長期的な維持管理にかかるコストの縮減を図っていく。

【予防保全Ⅰ型(重点管理)】

・第三者被害を防止を目的とし、ほぼ健全な状態を保って長持ちさせるため、重点的に予防対策を実施する管理方法。

【予防保全Ⅱ型(予防保全)】

・外見的な劣化損傷が顕在化する前に予防対策を実施する管理方法。

【予防保全Ⅲ型】

・最低限となる予防保全型での管理方法。

【監視型】

・対策を実施するまでの間、変状の挙動を追跡的に把握し安全性を確保する管理方法。

【対症療法型】

・従来型の維持管理であり、欠損などの大きな損傷が確認された後に対策を実施する管理方法。

⑵新技術活用に関する基本方針

本市においては、新技術の適用が効果的となる特殊橋や長大橋が少なく、コスト縮減・工期 短縮等の実効性が低いため、新技術の導入は難しいが、点検や修繕設計時に新技術の適用も含めた工法を検討し、状況に応じて採用していく。

令和10年度までに管理する橋梁のうち2橋で新技術を活用した修繕を行い、従来技術を活用した修繕と比較して、ランニングコストを含めた約2,200千円のコスト縮減を見込んでいる。

⑶集約化・撤去に関する方針

令和17年度までに管理する橋梁のうち2橋について、撤去の検討を行う。修繕費が削減されることにより約84,200千円縮減を見込んでいる。

また、供用開始当時に比べ、利用状況が著しく減少している橋梁もあることから、現在の利用状況を把握 し、地元の意見を踏まえたうえで、橋の統合や廃止を視野に入れた維持管理を検討していく。

5. 対象橋梁毎の概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

1） 10年間の計画内容
603橋における2020年(R2)から10年間の対策時期の目安を以下に示します。
社会情勢を踏まえて適宜変更することがあります。

概算費用(千円)
上段	設計費
下段	工事費

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期 2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	主な損傷
11134-1号橋	市道	1-1134号線	8.6	1975	51	R6	Ⅰ	320					点検					点検	概ね健全である
								2464		ひび割れ注入&断面修復 等									
11372-1号橋	市道	１－１３７２号線	3.9	2021	5	R7	Ⅰ	55		点検					点検				概ね健全である
								423		ひび割れ注入&断面修復 等									
宇津野橋	市道	１－２２１３号線	2.8	1958	68	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
								17012		更新									
15620-1号橋	市道	1－5620号線	3.75	1968	58	R6	Ⅳ	4323					点検					点検	主桁の腐食 床版の腐食
								9300						主桁架設工、断面修復、伸縮装置取替工 等					
23681-1号橋	市道	2-3681号線	4.3	1964	62	R6	Ⅱ	105					点検					点検	主桁のひびわれ
								809		ひび割れ注入&断面修復 等									
23683-1号橋	市道	2-3683号線	4.31	1962	64	R6	Ⅱ	105					点検					点検	主桁の鉄筋露出、うき
								809		ひび割れ注入&断面修復 等									
23678-2号橋	市道	2-3678号線	4.33	1961	65	R6	Ⅱ	107					点検					点検	主桁のひびわれ、うき
								820		ひび割れ注入&断面修復 等									
1-41-1号橋	市道	市道1級41号線	8.65	1970	56	R6	Ⅱ	303					点検					点検	下部工のひびわれ、洗堀
								2330		ひび割れ注入&断面修復 等									
31451-1号橋	市道	3-1448号線	4.3	1962	64	R6	Ⅱ	183					点検					点検	主桁の定着部の異常 床版のひびわれ
								1405		ひび割れ注入&断面修復 等									
32074-1号橋	市道	3-2074号線	3.05	1975	51	R6	Ⅲ	59					点検					点検	主桁の鉄筋露出、うき
								454		ひび割れ注入&断面修復 等									
32607-1号橋	市道	3-2607号線	6	1971	55	R6	Ⅰ	71					点検					点検	概ね健全である
								544		種ケシル&塗装&当て板補強 等									
32227-1号橋	市道	3-2227号線	4.5	1961	65	R6	Ⅲ	268					点検					点検	主桁のひびわれ
								2059		ひび割れ注入&断面修復 等									
1-34-1号橋	市道	市道1級34号線	3.48	1980	46	R6	Ⅲ	202					点検					点検	主桁のひびわれ、鉄筋露出
								1557		ひび割れ注入&断面修復 等									
シカノマイ橋	市道	4-3029号線	3.3	1965	61	R7	Ⅱ	132	点検					点検					下部工の鉄筋露出
								1015		断面修復 等									
オキタ橋	市道	4-3035号線	3.3	1965	61	R6	Ⅰ	78					点検					点検	概ね健全である
								601		ひび割れ注入&断面修復 等									
ナカタ橋	市道	4-3038号線	3.3	1965	61	R6	Ⅱ	78					点検					点検	主桁の鉄筋露出
								601		ひび割れ注入&断面修復 等									
シオイリ橋	市道	4-3039号線	3.3	1965	61	R6	Ⅱ	78					点検					点検	主桁の鉄筋露出
								601		ひび割れ注入&断面修復 等									
カブキ橋	市道	4-3040号線	3.3	1965	61	R6	Ⅱ	82					点検					点検	主桁の鉄筋露出
								631		ひび割れ注入&断面修復 等									
ワリアマシ橋	市道	4-3041号線	2.3	1965	61	R6	Ⅱ	58					点検					点検	主桁の鉄筋露出
								446		ひび割れ注入&断面修復 等									
43604-1号橋	市道	4-3604号線	7.12	1959	67	R6	Ⅱ	125					点検					点検	主桁の鉄筋露出
								959		ひび割れ注入&断面修復 等									
44093-4号橋	市道	4-4093号線	35.38	1978	48	R4	Ⅲ	7827		設計	点検					点検			主桁・床版のひびわれ、遊離石灰 下部工のひびわれ
								60210			表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&橋面防水								
54073-1号橋	市道	市道5-4073号線	4.3	1968	58	R3	Ⅲ	107		点検					点検				主桁の鉄筋露出
								820		ひび割れ注入&断面修復 等									
堂免橋	市道	6－4251号線	18.3	1975	51	R3	Ⅰ	1061	設計	点検					点検				概ね健全である
								8160		ひび割れ注入&断面修復 等									
11013-1号橋	市道	1-1013号線	2.4	1971	55	R6	Ⅰ	49					点検					点検	下部工の欠損
								376		ひび割れ注入&断面修復 等									

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
1-1-2号橋	市道	市道1級1号線	3.7	1979	47	R7	Ⅰ	158	点検					点検					概ね健全である
								1214		ひび割れ注入&断面修復 等									
並木大橋	市道	4-4252号線	80.9	1978	48	R5	Ⅲ	4528		調査・設計		点検					点検		主桁のひびわれ 斜材保護カバーの腐食、亀裂
								34834			表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等								
寺前橋	市道	1-1123号線	5.27	1975	51	R6	Ⅱ	117					点検					点検	下部工のひびわれ、欠損
								897			ひび割れ注入&断面修復 等								
11128-1号橋	市道	1-1128号線	6.35	1977	49	R6	Ⅰ	203					点検					点検	下部工の洗堀
								1559			ひび割れ注入&断面修復 等								
11170-2号橋	市道	1-1170号線	6.35	1977	49	R6	Ⅱ	203					点検					点検	下部工の洗堀
								1559			ひび割れ注入&断面修復 等								
11382-2号橋	市道	1-1382号線	5.3	1979	47	R6	Ⅱ	240					点検					点検	下部工の洗堀
								1848			ひび割れ注入&断面修復 等								
11256-2号橋	市道	1-1256号線	2.16	1974	52	R6	Ⅰ	58					点検					点検	下部工の洗堀
								448			ひび割れ注入&断面修復 等								
11372-3号橋	市道	１－１３７２号線	2.4	1973	53	R3	Ⅲ	82		点検					点検				下部工の洗堀
								631			ひび割れ注入&断面修復 等								
14301-1号橋	市道	1－4301号線	5	1986	40	R3	Ⅲ	93		点検					点検				主桁の腐食
								714			種ケレル塗装&当て板補強 等								
23040-1号橋	市道	2-3040号線	3.3	1974	52	R6	Ⅱ	45					点検					点検	主桁の鉄筋露出、うき
								348			ひび割れ注入&断面修復 等								
23633-1号橋	市道	2-3633号線	5.35	1978	48	R6	Ⅱ	173					点検					点検	下部工の洗堀
								1332			ひび割れ注入&断面修復 等								
構改三号橋	市道	3-1036号線	7.3	1966	60	R6	Ⅱ	258					点検					点検	下部工の洗堀
								1982			ひび割れ注入&断面修復 等								
31481-1号橋	市道	3-1481号線	8.5	1961	65	R6	Ⅱ	246					点検					点検	下部工の洗堀
								1894			ひび割れ注入&断面修復 等								
32065-1号橋	市道	3-2065号線	3.45	1973	53	R6	Ⅱ	61					点検					点検	主桁の鉄筋露出、うき
								469			ひび割れ注入&断面修復 等								
32098-1号橋	市道	3-2098号線	3.45	1965	61	R6	Ⅱ	54					点検					点検	主桁の鉄筋露出
								412			ひび割れ注入&断面修復 等								
32099-1号橋	市道	3-2099号線	3.05	1971	55	R6	Ⅱ	54					点検					点検	主桁の鉄筋露出、うき
								412			ひび割れ注入&断面修復 等								
1036-1号橋	市道	1036号線	4.3	1985	41	R6	Ⅱ	204					点検					点検	主桁のひびわれ、遊離石灰
								1570			ひび割れ注入&断面修復 等								
32262-1号橋	市道	3-2262号線	12	1964	62	R4	Ⅳ				点検					点検			木製下部工の腐朽
								16083			更新								
41407-1号橋	市道	4-1407号線	2.4	1967	59	R6	Ⅱ	154					点検					点検	主桁の鉄筋露出 下部工の鉄筋露出、うき
								1188			ひび割れ注入&断面修復 等								
久保田橋	市道	4-3379号線	62.14	1981	45	R3	Ⅱ	2380		点検・設計					点検				主桁の遊離石灰 下部工のひびわれ、鉄筋露出
								43927			耐震補強	橋脚補強 等							
宍塚橋	市道	4-3423号線	50.65	1982	44	R6	Ⅱ						点検					点検	主桁、床版のひびわれ
								91742			耐震補強	橋脚補強 等							
44295-1号橋	市道	4-4295号線	2.4	1960	66	R6	Ⅲ	621					点検					点検	下部工の鉄筋露出
								4773			ひび割れ注入&断面修復 等								
53032-1号橋	市道	市道5-3032号線	7.5	1962	64	R5	Ⅳ					点検					点検		下部工の傾斜、ひびわれ
								40896			更新								
並木橋	市道	5-3721号線	50.05	1980	46	R6	Ⅱ	2289		設計			点検					点検	主桁・床版のひびわれ
								68082			耐震補強	橋脚補強 等							
53312-1号橋	市道	市道5-3312号線	45	2023	3	R7	Ⅰ							点検					概ね健全である
								69828					更新						
54514-1号橋	市道	市道5-4514号線	8.45	1955	71	R5	Ⅲ	288				点検					点検		下部工の洗堀
								2214			ひび割れ注入&断面修復 等								

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期 2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	主な損傷
小田橋	市道	市道１級１７号線	34.1	1972	54	R6	Ⅲ	1406					点検					点検	護岸の洗堀
								10813				一種ケレン&塗装&当て板補強 等							下部工、床版の腐食
中貫橋	市道	市道１級３号線	30.5	2000	26	R3	Ⅱ	2934		点検	設計				点検			設計	木製床版の腐朽
								22571				木製床版打換え 等							下部工の腐食
入原橋	市道	4-3459号線	55.75	1981	45	R6	Ⅱ	2027			設計		点検					点検	下部工のひびわれ
								15590				ひび割れ注入 等							
中央1号橋	市道	4-4075号線	58.1	1994	32	R4	Ⅱ	3072		設計	点検					点検			主桁・下部工のひびわれ、遊離石灰
								23634						表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&橋面防水					
44093-1号橋	市道	4-4093号線	35.38	1979	47	R4	Ⅱ	2066			点検・設計					点検			主桁のひびわれ、鉄筋露出
								15893						表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等					床版のひびわれ、遊離石灰
44093-3号橋	市道	4-4093号線	49.45	1980	46	R3	Ⅱ	3585		点検	設計				点検			設計	主桁・下部工のひびわれ
								27577						表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&橋面防水					床版の鉄筋露出
竹園橋	市道	4-4102号線	68.7	1974	52	R4	Ⅲ	5169			点検	設計				点検			主桁のひびわれ
								39760				ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等							床版のひびわれ、遊離石灰
44052-4号橋	市道	4-4052号線	13.5	1978	48	R5	Ⅱ	1290				点検					点検		床版の遊離石灰
								9923				ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等							下部工のひびわれ、鉄筋露出
44052-5号橋	市道	4-4052号線	13.5	1978	48	R3	Ⅱ	881		点検					点検				床版の遊離石灰
								6773				ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等							下部工の鉄筋露出
44052-6号橋	市道	4-4052号線	18.8	1979	47	R3	Ⅱ	4316		点検		設計			点検				下部工のひびわれ、遊離石灰
								25000							ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等				
春日北橋	市道	4-4079号線	46	1979	47	R5	Ⅱ	2846				点検・設計					点検		主桁・床版のひびわれ
								21890							ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等				下部工の漏水
44441-1号橋	市道	4-4441号線	40.8	1979	47	R3	Ⅱ	1233		点検			設計		点検			設計	主桁のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
								9481							表面被覆&断面修復&橋面防水 等				下部工のひびわれ、遊離石灰
講和橋	市道	市道１級５７号線	18.66	1975	51	R7	Ⅰ	1631		点検	設計			点検				設計	概ね健全である
								12544				橋面防水＆舗装打替え 等							
諏訪歩道橋	市道	7-2070号線	21	2009	17	R5	Ⅰ	572			設計	点検					点検		概ね健全である
								4399				ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等							
大久保橋	市道	4-3471号線	41.7	1981	45	R3	Ⅲ	934	耐震設計	点検				設計	点検				主桁のひびわれ
								7184						表面被覆&ひび割れ注入＆断面修復＆橋面防水					床版のひびわれ、鉄筋露出
下広岡橋	市道	4-3618号線	48.99	1981	45	R3	Ⅲ	7156		点検				設計	点検				下部工のひびわれ、遊離石灰
								68000						表面被覆&ひび割れ注入＆断面修復＆橋面防水					主桁・床版・下部工のひびわれ
吾妻セントラル歩道橋	市道	4-4052号線	64.16	1978	48	R4	Ⅱ	6995			点検		設計			点検			主桁・下部工のひびわれ、遊離石灰
								53809						表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&橋面防水					床版のひびわれ
花室1号橋	市道	4-4127号線	66.8	1979	47	R4	Ⅱ	3744			点検		設計			点検			主桁・下部工のひびわれ、鉄筋露出
								28799						表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&橋面防水					床版のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
洞峰橋	市道	4-4226号線	63	1980	46	R5	Ⅱ	4066				点検・設計					点検		主桁のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
								31281					ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等						床版のひびわれ、遊離石灰
土浦学園線3号橋	市道	4-4141号線	61.07	1979	47	R3	Ⅱ	3220		点検		設計			点検			設計	下部工のひびわれ
								24767					ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等						主桁のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
飛行場橋	市道	市道2級46号線	56.2	1980	46	R7	Ⅱ	6709	点検			設計 耐震設計		点検					床版のひびわれ、遊離石灰
								76812					耐震補強	橋脚補強 等					主桁のひびわれ、鉄筋露出、定着部の異常
成見橋	市道	市道2級39号線	40.14	1974	52	R4	Ⅱ	1488			点検	設計				点検			床版の鉄筋露出、遊離石灰
								11449					ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等						下部工のひびわれ、遊離石灰
出戸橋	市道	4-3412号線	51.05	1981	45	R3	Ⅱ	3044		点検			設計		点検				主桁のひびわれ、遊離石灰
								48984						耐震補強	橋脚補強 等				床版の遊離石灰
桜大橋	市道	4-4052号線	56.1	1979	47	R3	Ⅱ	16701		点検			設計		点検				下部工のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
								128468						ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等					主桁・床版・下部工のひびわれ
山中橋	市道	5－1520号線	16	1973	53	R4	Ⅱ	676			点検		設計			点検			主桁の定着部の異常
								5203						ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等					床版の鉄筋露出
苅間歩道橋	市道	5-2034号線	52.14	1979	47	R5	Ⅱ	2178				点検	設計				点検		主桁・床版・下部工の遊離石灰
								16756						ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等					
サギ沼橋	市道	5-6004号線	58.61	1980	46	R7	Ⅱ	2680	点検	耐震設計			設計	点検					主桁のひびわれ、鉄筋露出、定着部の異常
								41399						耐震補強	橋脚補強 等				床版のひびわれ、遊離石灰
江戸橋	市道	市道２級５３号線	20	1973	53	R7	Ⅱ	1278		点検			設計	点検					下部工のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
								9832						ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等					床版の遊離石灰
池下橋	市道	4－2243号線	23.74	1974	52	R4	Ⅱ	1209			点検			設計		点検			主桁の鉄筋露出、定着部の異常
								9298							ひび割れ注入&断面修復&橋面防水 等				床版の遊離石灰

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期 2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	主な損傷
吉瀬橋	市道	4-3407号線	59.6	1981	45	R3	Ⅱ	9687		点検		耐震設計		設計	点検				主桁のひびわれ、遊離石灰
								100186							耐震補強(橋脚補強)		等		床版のひびわれ 下部工のひびわれ、鉄筋露出
原山橋	市道	4-3421号線	50.74	1981	45	R3	Ⅱ	2138		点検		耐震設計		設計	点検				主桁のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
								41991							耐震補強	橋脚補強	等		床版のひびわれ、遊離石灰 下部工のひびわれ
並木北橋	市道	1016号線	52.4	1979	47	R5	Ⅱ	2978				点検		設計			点検		主桁・床版・下部工の遊離石灰
								22907							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		
下出口橋	市道	5-2526号線	58.7	1980	46	R7	Ⅱ	1818	点検			耐震設計		点検・設計					主桁のひびわれ、鉄筋露出、定着部の異常
								39308							耐震補強	橋脚補強	等		床版の遊離石灰 下部工のひびわれ、鉄筋露出
大日橋	市道	5-2562号線	57.29	1980	46	R6	Ⅲ	9637					点検	設計				点検	主桁・床版・下部工のひびわれ
								74131							耐震補強	橋脚補強	等		
丸山橋	市道	5－3550号線	41.92	1972	54	R4	Ⅱ	1372			点検			設計		点検			主桁の定着部の異常 床版の鉄筋露出
								10553							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		
吾妻南橋	市道	4-4094号線	52.7	1978	48	R4	Ⅱ	6618			点検				設計	点検			床版のひびわれ
								50904							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		下部工のひびわれ、うき
花室2号橋	市道	4-4128号線	61.1	1979	47	R4	Ⅱ	4852			点検				設計	点検			主桁・下部工のひびわれ、遊離石灰
								37325							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		床版の遊離石灰
竹園北橋	市道	4-4129号線	52.7	1978	48	R4	Ⅱ	4960			点検				設計	点検			主桁・床版・下部工のひびわれ
								38154							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		
竹園南橋	市道	4-4110号線	52.7	1978	48	R4	Ⅱ	2757			点検				設計	点検			主桁・床版のひびわれ
								21209							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		下部工のひびわれ、鉄筋露出
春日南橋	市道	4-4089号線	64	1979	47	R5	Ⅱ	3245				点検			設計		点検		主桁のひびわれ
								24964							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		床版の鉄筋露出、遊離石灰 下部工のひびわれ、遊離石灰
小白硲橋	市道	5－1676号線	30.85	1974	52	R4	Ⅱ	1395			点検				設計	点検			主桁のひびわれ
								10728							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		下部工のひびわれ、鉄筋露出
松代橋	市道	5-2174号線	74	1980	46	R5	Ⅱ	4149				点検			設計		点検		主桁の鉄筋露出 床版の遊離石灰
								31919							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		下部工の沈下
44052-1号橋	市道	4-4052号線	59.1	1975	51	R4	Ⅱ	11218			点検					点検・設計			主桁の鉄筋露出 床版のひびわれ
								86288							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		下部工のひびわれ、遊離石灰
吾妻北橋	市道	4-4072号線	52.7	1978	48	R4	Ⅱ	5823			点検					点検・設計			主桁・床版のひびわれ 下部工のひびわれ
								44793							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		
44052-3号橋	市道	4-4052号線	59.1	1978	48	R4	Ⅱ	3875			点検					点検・設計			主桁のひびわれ、鉄筋露出 床版のひびわれ
								29809							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		下部工のひびわれ、遊離石灰
おか橋	市道	5－1464号線	16.02	1974	52	R4	Ⅱ	3861			点検					点検・設計			主桁の定着部の異常 床版の遊離石灰
								29698							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		
大塚橋	市道	市道1級64号線	49.49	1981	45	R7	Ⅱ	4929	点検					点検		設計			主桁の遊離石灰、鉄筋露出 床版の遊離石灰
								37915							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		下部工のひびわれ、鉄筋露出
土橋	市道	6－4174号線	18.3	1975	51	R4	Ⅱ	466			点検					点検・設計			主桁の定着部の異常
								3584							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		
一ツ橋	市道	4－3006号線	22.91	1974	52	R4	Ⅱ	5039			点検					点検	設計		主桁のひびわれ
								38758							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		床版のひびわれ、遊離石灰
下広岡橋	市道	市道２級２９号線	36.1	1975	51	R3	Ⅱ	1416		点検					点検		設計		主桁の剥離、定着部の異常
								10889				橋面防水＆舗装打替え							
面野井跨道橋	市道	５－１３７８号線	36.5	1984	42	R3	Ⅱ	884		点検					点検		設計		主桁のひびわれ
								6802							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		下部工の沈下
上橋	市道	5－1590号線	18.59	1975	51	R4	Ⅱ	705			点検					点検	設計		主桁の定着部の異常
								5424							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		
柳橋	市道	市道5-1586号線	18.64	1983	43	R5	Ⅱ	1260				点検					点検・設計		主桁のひびわれ
								9692							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		
大和田橋	市道	１０２１号線	18.56	1987	39	R3	Ⅱ	1936		点検					点検		設計		主桁の定着部の異常
								14889							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		下部工のひびわれ
笠丸橋	市道	1024号線	17.11	1975	51	R4	Ⅱ	5881			点検					点検	設計		主桁のひびわれ
								45237							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		床版の遊離石灰
羽成橋	市道	5－3493号線	41.15	1973	53	R4	Ⅱ	7319			点検					点検	設計		主桁のひびわれ、遊離石灰
								56304							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		床版のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰 下部工のひびわれ
福田橋	市道	5－4729号線	30.11	1976	50	R4	Ⅱ	7449			点検					点検	設計		主桁の腐食、ボルト脱落
								57302							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		床版のひびわれ、遊離石灰
大橋	市道	市道１級６７号線	19.5	1976	50	R3	Ⅱ	722		点検					点検		設計		主桁の定着部の異常
								5555							ひび割れ注入&断面	修復&橋面防水	等		

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
11001-1号橋	市道	1-1001号線	3.35	1977	49	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の剥離、鉄筋露出
11022-1号橋	市道	1-1022号線	3	1977	49	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11039-1号橋	市道	1-1039号線	5.1	1978	48	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11062-1号橋	市道	1-1062号線	2.5	1980	46	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11061-1号橋	市道	1-1061号線	2.65	1964	62	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11069-1号橋	市道	1-1069号線	2.27	1967	59	R6	Ⅱ						点検						主桁の鉄筋露出 下部工のひびわれ
11104-1号橋	市道	1-1104号線	6.27	1979	47	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
寺沢橋	市道	市道1級1号線	4.18	1977	49	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11089-1号橋	市道	1-1089号線	2.55	1977	49	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の剥離、鉄筋露出
11159-1号橋	市道	1-1159号線	5.4	1977	49	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11159-2号橋	市道	1-1159号線	5.35	1977	49	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
竹の下橋	市道	1-1129号線	4.45	1979	47	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
杉の下橋	市道	1-1170号線	3.7	1986	40	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
地蔵橋	市道	市道1級1号線	5.1	1985	41	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11151-1号橋	市道	1-1151号線	3.6	1985	41	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11155-1号橋	市道	1-1155号線	3.63	1985	41	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11160-1号橋	市道	1-1160号線	6.35	1977	49	R7	Ⅱ		点検					点検					橋台の洗堀
11161-1号橋	市道	1-1161号線	7.3	1977	49	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
1-1-4号橋	市道	市道1級1号線	3.8	1981	45	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11206-1号橋	市道	1-1206号線	3	1978	48	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
1-1-5号橋	市道	市道1級1号線	2.89	1948	78	R5	Ⅱ					点検					点検		下部工の変形・欠損
11245-1号橋	市道	1-1245号線	5.38	1978	48	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11378-1号橋	市道	1-1378号線	5.49	1978	48	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11382-1号橋	市道	1-1382号線	5.39	1978	48	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11397-1号橋	市道	1-1397号線	7.35	1978	48	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11381-1号橋	市道	１－１３８１号線	10.5	1978	48	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11376-1号橋	市道	1-1376号線	10.4	1979	47	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰
天ヶ堰橋	市道	1－1381号線	17.82	1984	42	R4	Ⅱ				点検					点検			部材の腐食
双ツ橋	市道	1－1422号線	17.98	1983	43	R4	Ⅱ				点検					点検			横桁の鉄筋露出

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用（千円）	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
11400-1号橋	市道	1-1400号線	10.4	1979	47	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰
11401-1号橋	市道	1-1401号線	7.3	1979	47	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰
11382-3号橋	市道	1-1382号線	6.3	1979	47	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰
11403-1号橋	市道	1-1403号線	6.3	1979	47	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰
またじ橋	市道	1-1419号線	2.7	1977	49	R6	Ⅱ						点検						主桁の鉄筋露出
11402-1号橋	市道	1-1402号線	5.3	1979	47	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11415-1号橋	市道	1-1415号線	2.9	1983	43	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
千手橋	市道	市道1級1号線	3.5	1983	43	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
中の沢橋	市道	市道1級1号線	6.06	1990	36	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11372-2号橋	市道	1-1372号線	2.95	1981	45	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11256-1号橋	市道	1-1256号線	3.1	1984	42	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
11364-1号橋	市道	１－１３６４号線	5.43	2010	16	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11337-1号橋	市道	１－１３３７号線	2.55	1965	61	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁のうき
11313-1号橋	市道	１－１３１３号線	4.64	1967	59	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11472-1号橋	市道	１－１４７２号線	6.05	1983	43	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
1-9-1号橋	市道	市道１級９号線	3	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11509-1号橋	市道	１－１５０９号線	3	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11510-1号橋	市道	１－１５１０号線	2	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11497-1号橋	市道	１－１４９７号線	4.4	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11514-1号橋	市道	１－１５１４号線	4.4	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
日野橋	市道	１－１５８２号線	9.1	1979	47	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
館野橋	市道	１－１５９２号線	9	1979	47	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11571-1号橋	市道	１－１５７１号線	6.5	1973	53	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11568-1号橋	市道	１－１５６８号線	6.5	1972	54	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の鉄筋露出
11567-1号橋	市道	１－１５６７号線	3.4	1984	42	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11527-1号橋	市道	１－１５２７号線	6.4	1978	48	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の遊離石灰
1-9-2号橋	市道	市道１級９号線	5.4	1967	59	R3	Ⅱ			点検					点検				下部工の遊離石灰
11544号橋	市道	１－１５４４号線	5.5	1988	38	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の鉄筋露出
六所橋	市道	１－１５４８号線	3.7	1971	55	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用（千円）	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
1-9-3号橋	市道	市道１級９号線	5.5	1971	55	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
芝川橋	市道	１－１５４８号線	9.8	1965	61	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
1-9-4号橋	市道	市道１級９号線	2.15	1986	40	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
逆川橋	市道	１－１５５７号線	8.4	1970	56	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11538-2号橋	市道	１－１５３８号線	3	1986	40	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11538-1号橋	市道	１－１５３８号線	9.4	1967	59	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
11559-1号橋	市道	１－１５５９号線	2.5	1986	40	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁のひびわれ
11596-1号橋	市道	１－１５９６号線	12	1983	43	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
ソリ田橋	市道	市道１級９号線	2.5	1948	78	R3	Ⅱ			点検					点検				下部工のひびわれ
12225-1号橋	市道	１－２２２５号線	2.5	1948	78	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁のひびわれ
かさね橋	市道	１－２２１５号線	2.45	1958	68	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
2-5-1号橋	市道	市道２級５号線	4	1965	61	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁のひびわれ
12004-1号橋	市道	１－２００４号線	2.6	1990	36	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁のひびわれ
12003-1号橋	市道	１－２００３号線	9.4	1988	38	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12002-1号橋	市道	１－２００２号線	9.62	1988	38	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12001-1号橋	市道	１－２００１号線	9.4	1988	38	R3	Ⅱ			点検					点検				床版の遊離石灰
1-10-1号橋	市道	市道１級１０号線	2.6	1972	54	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁・下部工のひびわれ
小沢前橋	市道	１－２３２７号線	3.9	1964	62	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
石田橋	市道	１－２３３３号線	4.3	1964	62	R3	Ⅱ			点検					点検				下部工のひびわれ
多気太郎橋	市道	１－２３５９号線	3.5	1968	58	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
伊勢長橋	市道	１－２５０６号線	3.3	1963	63	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12403-1号橋	市道	１－２４０３号線	4	1965	61	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
市村橋	市道	１－２４０６号線	2.9	1970	56	R3	Ⅱ			点検					点検				下部工のひびわれ
はっとり橋	市道	１－２４２６号線	2.2	1997	29	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
平成橋	市道	１－２５５７号線	8.6	1998	28	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12558-1号橋	市道	１－２５５８号線	2	1975	51	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
中沢橋	市道	市道１級１１号線	3	1975	51	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12626-1号橋	市道	１－２６２６号線	2.25	1965	61	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の鉄筋露出

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
12622-1号橋	市道	１－２６２２号線	2.9	1948	78	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の遊離石灰 下部工の鉄筋露出
12603-1号橋	市道	１-２６０３号線	2	1969	57	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の鉄筋露出
12653-1号橋	市道	１－２６５３号線	3.75	1968	58	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁のひびわれ
12673-1号橋	市道	１－２６７３号線	2.1	1974	52	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
1-11-1号橋	市道	市道１級１１号線	2.3	1966	60	R3	Ⅱ			点検					点検				下部工の洗堀
長草橋	市道	市道１級１１号線	2.4	1967	59	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12681-1号橋	市道	１－２６８１号線	2.2	1965	61	R3	Ⅱ			点検					点検				下部工の沈下
12677-1号橋	市道	１－２６７７号線	2.5	1973	53	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12709-1号橋	市道	１－２７０９号線	2.43	1975	51	R3	Ⅱ			点検					点検				下部工の鉄筋露出
1-11-2号橋	市道	市道１級１１号線	3.4	1976	50	R3	Ⅱ			点検					点検				下部工のひびわれ
12711-1号橋	市道	１－２７１１号線	4.9	1978	48	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12712-1号橋	市道	１－２７１２号線	2.54	1968	58	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の鉄筋露出
12712-2号橋	市道	１－２７１２号線	5.9	1968	58	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の鉄筋露出
12726-1号橋	市道	１－２７２６号線	3.1	1978	48	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12820-1号橋	市道	１－２８２０号線	3.1	1965	61	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12816-1号橋	市道	１－２８１６号線	2.6	1984	42	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12856-1号橋	市道	１－２８５６号線	2.91	1977	49	R3	Ⅲ			点検					点検				下部工の洗堀
12859-1号橋	市道	１－２８５９号線	5.3	1976	50	R3	Ⅱ			点検					点検				下部工のひびわれ
12925-1号橋	市道	１－２９２５号線	2.6	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12921-1号橋	市道	１－２９２１号線	6.3	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12920-1号橋	市道	１－２９２０号線	6.3	1981	45	R3	Ⅱ			点検					点検				床版の遊離石灰
12919-1号橋	市道	１－２９１９号線	6.3	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12917-1号橋	市道	１－２９１７号線	6.3	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12916-1号橋	市道	１－２９１６号線	2	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12322-1号橋	市道	１－２３２２号線	2.3	1974	52	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
12812-1号橋	市道	１－２８１２号線	6.3	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
13093-2号橋	市道	１－３０９３号線	2	1990	36	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の遊離石灰
13009-1号橋	市道	１－３００９号線	12.5	1981	45	R3	Ⅱ			点検					点検				鋼材の腐食
2-8-1号橋	市道	市道２級８号線	8.5	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用（千円）	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
1-14-3号橋	市道	市道１級１４号線	2	1989	37	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
豊越橋	市道	１－３１４８号線	2.35	1970	56	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
13212-1号橋	市道	１－３２１２号線	2	1990	36	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
初酉橋	市道	１－３１６４号線	10.95	2000	26	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
13238-1号橋	市道	１－３２３８号線	10.9	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
13213-1号橋	市道	１－３２１３号線	10.8	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
13214-1号橋	市道	１－３２１４号線	10.5	1981	45	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
13214-2号橋	市道	１－３２１４号線	2	1990	36	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
八幡橋	市道	市道２級６号線	13.5	1954	72	R3	Ⅲ			点検					点検				主桁の鉄筋露出
13190-1号橋	市道	1－3190号線	9	1975	51	R4	Ⅱ				点検					点検			床版の遊離石灰
13199-2号橋	市道	1－3199号線	8	1978	48	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13228-1号橋	市道	1－3228号線	2.5	1989	37	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13228-2号橋	市道	1-3228号線	10.5	1982	44	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13401-1号橋	市道	1-3401号線	7	1981	45	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13199-1号橋	市道	1－3199号線	2.5	1989	37	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁のひびわれ、遊離石灰
1-14-1号橋	市道	市道１級１４号線	7.35	1981	45	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
1-14-2号橋	市道	市道１級１４号線	10.4	1982	44	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13410-3号橋	市道	1-3410号線	6.35	1982	44	R4	Ⅱ				点検					点検			床版の遊離石灰
13410-2号橋	市道	1-3410号線	9.45	1982	44	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13228-3号橋	市道	1-3228号線	3	1989	37	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工の遊離石灰、うき
13407-1号橋	市道	1－3407号線	3	1989	37	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13400-1号橋	市道	1－3400号線	8	1984	42	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工のひびわれ
13213-2号橋	市道	1－3213号線	6	1982	44	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工のひびわれ
13412-2号橋	市道	1-3412号線	8.45	1978	48	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13412-1号橋	市道	1－3412号線	2.9	1984	42	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13429-2号橋	市道	1－3429号線	3	1984	42	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁のひびわれ
13429-1号橋	市道	1－3429号線	8.45	1983	43	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用（千円）	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
13499-1号橋	市道	１－３４９９号線	2.4	1975	51	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁のひびわれ
13434-1号橋	市道	1－3434号線	2.6	1984	42	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13441-1号橋	市道	1－3441号線	2.6	1984	42	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13434-2号橋	市道	1－3434号線	8.4	1979	47	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
13316-1号橋	市道	1－3316号線	11.4	1979	47	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13508-1号橋	市道	１－３５０８号線	2.5	1965	61	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁のひびわれ
辻前橋	市道	1－3557号線	2.7	1980	46	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工の鉄筋露出
今宿橋	市道	市道1級17号線	2.7	1978	48	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁のひびわれ
三枚橋	市道	１－３５６３号線	3.9	1982	44	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
13580-1号橋	市道	1－3580号線	2.5	1965	61	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁のうき
13582-1号橋	市道	１－３５８２号線	3.6	1984	42	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁のひびわれ
13608-1号橋	市道	1－3608号線	5.35	1967	59	R4	Ⅲ				点検					点検			主桁の鉄筋露出
13607-1号橋	市道	1－3607号線	4.7	1962	64	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
13431-1号橋	市道	1－3431号線	5.35	1964	62	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13036-1号橋	市道	1－3036号線	3	1990	36	R4	Ⅱ				点検					点検			鋼材の腐食
13047-1号橋	市道	1－3047号線	3.4	1990	36	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工のひびわれ、欠損
13075-1号橋	市道	1－3075号線	3.1	1990	36	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工の遊離石灰
13093-1号橋	市道	1－3093号線	2.5	1990	36	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13089-1号橋	市道	1－3089号線	4.38	1993	33	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13089-2号橋	市道	1－3089号線	2.5	1990	36	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13108-1号橋	市道	1－3108号線	2.5	1990	36	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13093-3号橋	市道	1－3093号線	2.5	1990	36	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
13410-1号橋	市道	1－3410号線	8	1987	39	R4	Ⅱ				点検					点検			床版の遊離石灰 下部工のひびわれ
クルワ橋	市道	1－3497号線	6.9	1968	58	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁の遊離石灰
14082-1号橋	市道	1－4082号線	5	1971	55	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
作谷橋	市道	１－４０９５号線	3	1947	79	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
2-2-1号橋	市道	市道2級2号線	4.8	1983	43	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
2-2-2号橋	市道	市道2級2号線	4.5	1947	79	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工のひびわれ、うき
14145-1号橋	市道	1－4145号線	11.5	1978	48	R4	Ⅱ				点検					点検			床版の遊離石灰 下部工の洗掘

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
14211-1号橋	市道	1－4211号線	8.5	1978	48	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
14212-1号橋	市道	1－4212号線	8.45	1978	48	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工の洗掘
14214-1号橋	市道	1－4214号線	8.5	1977	49	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
14215-1号橋	市道	1－4215号線	8.45	1977	49	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工の洗掘
14216-1号橋	市道	1－4216号線	8.4	1977	49	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
大橋	市道	市道１級１２号線	11.45	1977	49	R3	Ⅱ			点検					点検				床版の遊離石灰
小橋	市道	市道1級12号線	2.5	1947	79	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁の鉄筋露出
14495-1号橋	市道	1－4495号線	5.5	1971	55	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
14295-1号橋	市道	1－4295号線	4.5	1975	51	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁の鉄筋露出
14288-1号橋	市道	1－4288号線	4.5	1975	51	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
14360-1号橋	市道	1－4360号線	8.05	1977	49	R4	Ⅱ				点検					点検			床版の遊離石灰
14421-1号橋	市道	１－４４２１号線	6.2	1968	58	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の鉄筋露出
神明橋	市道	1－5779号線	100.09	2002	24	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁のひびわれ
15051-1号橋	市道	1－5051号線	5.35	1969	57	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15064-1号橋	市道	1－5064号線	5.35	1978	48	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15050-1号橋	市道	1－5050号線	5.35	1979	47	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工の洗掘
15060-1号橋	市道	1－5060号線	6	1980	46	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁の鉄筋露出
15061-1号橋	市道	1－5061号線	6.05	1981	45	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁の鉄筋露出
15063-1号橋	市道	1－5063号線	6.05	1978	48	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁の鉄筋露出
15087-1号橋	市道	1－5087号線	5.4	1978	48	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
1-2-1号橋	市道	市道1級2号線	5.35	1977	49	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15093-1号橋	市道	1－5093号線	5.35	1977	49	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15094-1号橋	市道	１－５０９４号線	5.4	1977	49	R3	Ⅱ			点検					点検				下部工の沈下
15088-1号橋	市道	1－5088号線	5.35	1977	49	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工の豆板
15089-1号橋	市道	1－5089号線	5.35	1977	49	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工の洗堀
15095-1号橋	市道	1－5095号線	6.7	1977	49	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
狭間橋	市道	市道1級5号線	6.1	1947	79	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
1-3-1号橋	市道	市道1級3号線	4.1	1947	79	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15476-1号橋	市道	１－５４７６号線	4	1980	46	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
山ノ神橋	市道	１－５４９７号線	3	1973	53	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の遊離石灰
大御門橋	市道	市道1級5号線	5.2	1949	77	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15721-1号橋	市道	1－5721号線	3	1980	46	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15722-1号橋	市道	1－5722号線	3	1980	46	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁のひびわれ・鉄筋露出
15715-1号橋	市道	1－5715号線	3	1980	46	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15714-1号橋	市道	1－5714号線	5.3	1978	48	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工の洗掘
15845-1号橋	市道	1－5845号線	5.4	1975	51	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15701-1号橋	市道	1－5701号線	6.45	1978	48	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15631-1号橋	市道	1－5631号線	2.5	1966	60	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15859-1号橋	市道	1－5859号線	3.4	1963	63	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15476-2号橋	市道	1－5476号線	4	1980	46	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15473-1号橋	市道	1－5473号線	9.4	1984	42	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
15469-1号橋	市道	1－5469号線	9.45	1985	41	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
1-4-1号橋	市道	市道１級４号線	2.42	1948	78	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁の鉄筋露出 下部工のひびわれ
11250-1号橋	市道	１－１２５０号線	4	1982	44	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
15791-1号橋	市道	1－5791号線	6.1	1948	78	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁のひびわれ
寿加橋	市道	市道2級20号線	7.4	1988	38	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
西田橋	市道	2-3781号線	7.45	1986	40	R7	Ⅱ		点検					点検					上部工鋼材の腐食
前田橋	市道	2-1392号線	7.35	1985	41	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
下田橋	市道	2-1403号線	7.75	1984	42	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
堤橋	市道	1006号線	8	1982	44	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
新中橋	市道	2-1508号線	8.2	1978	48	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
大平橋	市道	市道1級32号線	11.8	1984	42	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
あさひ橋	市道	2-1668号線	13.4	1984	42	R7	Ⅱ		点検					点検					上部工鋼材の腐食
1-32-1号橋	市道	市道1級32号線	5.2	1975	51	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
22049-1号橋	市道	2-2049号線	4.6	1990	36	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
22050-1号橋	市道	2-2050号線	4.6	1984	42	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
岩崎橋	市道	市道1級24号線	10.01	2000	26	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
22523-1号橋	市道	2-2523号線	6.37	1977	49	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
22515-1号橋	市道	2-2515号線	6.3	1975	51	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰
22514-1号橋	市道	2-2514号線	6.3	1976	50	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰
22472-1号橋	市道	2-2472号線	3.5	1975	51	R6	Ⅱ						点検					点検	主桁のひびわれ 下部工のひびわれ、うき
1-26-1号橋	市道	市道1級26号線	2.86	1975	51	R6	Ⅱ						点検						主桁のひびわれ、鉄筋露出 下部工のひびわれ
23036-1号橋	市道	2-3036号線	2.81	1968	58	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
23037-1号橋	市道	2-3037号線	2.81	1973	53	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
23038-1号橋	市道	2-3038号線	5.36	1969	57	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
23039-1号橋	市道	2-3039号線	5.34	1975	51	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
23041-1号橋	市道	2-3041号線	2.4	1984	42	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
23674-1号橋	市道	2-3674号線	4.3	1965	61	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の剥離、鉄筋露出
23680-1号橋	市道	2-3680号線	4.34	1966	60	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の剥離、鉄筋露出
23678-1号橋	市道	2-3678号線	4.34	1961	65	R6	Ⅱ						点検					点検	床版の漏水
23684-1号橋	市道	2-3684号線	4.33	1964	62	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の剥離、鉄筋露出
23686-1号橋	市道	2-3686号線	5	1965	61	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
23632-1号橋	市道	2-3632号線	5.3	1973	53	R7	Ⅱ		点検					点検					下部工の洗堀
23412-1号橋	市道	2-3412号線	6.5	1981	45	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
大砂橋	市道	市道1級19号線	6.3	1979	47	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
西高野橋	市道	市道1級19号線	7.3	1976	50	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰
23295-1号橋	市道	2-3295号線	6.3	1974	52	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
1-19-1号橋	市道	市道1級19号線	2.36	1975	51	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
23205-1号橋	市道	2-3205号線	2.32	1980	46	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
23248-1号橋	市道	2-3248号線	2.32	2002	24	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
西原橋	市道	2-3749号線	3.72	1984	42	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
大砂橋	市道	2-3749号線	4.3	1980	46	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
西高野橋歩道橋	市道	市道1級19号線	11.1	1998	28	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
新旭橋	市道	市道1級37号線	13.5	1989	37	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
北陸橋	市道	市道1級37号線	85.5	1974	52	R6	Ⅱ						点検					点検・脱針	床版のひびわれ 下部工のひびわれ
構改一号橋	市道	3-1143号線	7.3	1965	61	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
31360-1号橋	市道	3-1360号線	3.26	1963	63	R6	Ⅱ						点検					点検	主桁のゆるみ・脱落 下部工の剥離

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
31898-1号橋	市道	3-1898号線	3.27	1964	62	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
31444-1号橋	市道	3-1444号線	4.26	1963	63	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁鋼材の破断
31635-1号橋	市道	3-1635号線	2.91	1972	54	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の剥離、鉄筋露出
あやめ橋	市道	3-1769号線	9.45	1975	51	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
32050-1号橋	市道	3-2050号線	3.06	1965	61	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の鉄筋露出
32089-1号橋	市道	3-2089号線	3.03	1972	54	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の鉄筋露出
32090-1号橋	市道	3-2090号線	3.45	1972	54	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の鉄筋露出
第2角内橋	市道	市道1級39号線	14	1977	49	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁、上下部接続部の腐食
角内橋	市道	市道１級４０号線	16	1990	36	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
金村橋	市道	3-2433号線	2	1975	51	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
32584-1号橋	市道	3-2584号線	6	1975	51	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
32598-1号橋	市道	3-2598号線	6	1976	50	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
32599-1号橋	市道	3-2599号線	6	1978	48	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
32528-1号橋	市道	3-2528号線	5	1976	50	R7	Ⅲ		点検					点検					下部工の洗堀、杭露出
32623-1号橋	市道	3-2623号線	4.6	1959	67	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の縦締め金具の腐食
32648-1号橋	市道	3-2648号線	5	1975	51	R7	Ⅱ		点検					点検					床版鋼材の腐食
紫峰見橋	市道	3-2656号線	20.4	2002	24	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
33003-1号橋	市道	3-3003号線	6.35	1976	50	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
今鹿島橋	市道	3-3194号線	6.35	1978	48	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
2-21-1号橋	市道	市道2級21号線	6.38	1979	47	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
33134-1号橋	市道	3-3134号線	3.6	1975	51	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
33106-1号橋	市道	3-3106号線	3.48	1984	42	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
33264-1号橋	市道	3-3264号線	6.73	1985	41	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
33417-1号橋	市道	3-3417号線	7.35	1983	43	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁、床版鋼材の腐食
33361-1号橋	市道	3-3361号線	6.35	1972	54	R7	Ⅲ		点検					点検					下部工の洗堀、杭露出 橋台前面の護岸破損
1-34-2号橋	市道	市道1級34号線	3.4	1947	79	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
1010-1号橋	市道	1010号線	6	1990	36	R7	Ⅱ		点検					点検					床版のひびわれ
1010-2号橋	市道	1010号線	6.12	1990	36	R7	Ⅱ		点検					点検					床版のひびわれ
2-22-1号橋	市道	市道2級22号線	2.9	1985	41	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
33592-1号橋	市道	3-3592号線	2.9	2002	24	R7	Ⅱ		点検					点検					ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの傾斜
33021-1号橋	市道	3-3021号線	2.32	1984	42	R7	Ⅱ		点検					点検					舗装の凹凸
33658-1号橋	市道	3-3658号線	2.9	1998	28	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
33655-1号橋	市道	3-3655号線	2.9	1980	46	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
33632-1号橋	市道	3-3632号線	2.32	1999	27	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
33649-1号橋	市道	3-3649号線	2.32	1999	27	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
33644-1号橋	市道	3-3644号線	2.32	1999	27	R7	Ⅱ		点検					点検					頂版のひびわれ、剥離
33640-1号橋	市道	3-3640号線	2.32	1999	27	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
1-34-2号歩道橋	市道	市道1級34号線	6.9	1961	65	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
41412-1号橋	市道	4-1412号線	2.4	1967	59	R7	Ⅱ		点検					点検					頂版、側壁の剥離、鉄筋露出
41418-1号橋	市道	4-1418号線	2.2	1967	59	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
41454-1号橋	市道	4-1454号線	2.4	1980	46	R7	Ⅱ		点検					点検					側壁の剥離、鉄筋露出
松美橋	市道	4-2072号線	8	1975	51	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
柴崎橋	市道	市道2級25号線	7.7	1975	51	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰
山王橋	市道	4-2245号線	7.6	1975	51	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰
中橋	市道	市道2級25号線	6.4	1976	50	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
向橋	市道	4-2201号線	6.3	1976	50	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
東岡橋	市道	4-2293号線	7.65	1974	52	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
吾妻橋	市道	4-2231号線	7.1	1976	50	R7	Ⅳ		点検					点検					下部工のひびわれ
花室跨道橋	市道	4-2422号線	36.6	1971	55	R6	Ⅱ						点検					点検	下部工のうき
1-49-1号橋	市道	市道1級49号線	2.33	1972	54	R7	Ⅱ		点検					点検					頂版、側壁の剥離、鉄筋露出
ゴダンダ橋	市道	4-3031号線	3.3	1965	61	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の剥離、鉄筋露出
フカタ橋	市道	市道1級48号線	2.95	1976	50	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
中神橋	市道	4-3060号線	23.72	1974	52	R7	Ⅱ		点検					点検				設計	主桁の遊離石灰・ひびわれ 鋼材の腐食
マノウチ橋	市道	4-3042号線	2.3	1965	61	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁、橋台の剥離、鉄筋露出
ヨコタ橋	市道	4-3043号線	2.3	1965	61	R6	Ⅱ						点検						主桁の鉄筋露出 下部工の鉄筋露出
倉掛橋	市道	4-3120号線	23.54	1973	53	R7	Ⅲ		点検					点検				設計	主桁のひびわれ
上の室橋	市道	4-3171号線	31.19	1973	53	R7	Ⅱ		点検					点検					支承の腐食
渡戸橋	市道	4-3240号線	32.05	1973	53	R7	Ⅱ		点検					点検					支承の腐食

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
大角豆橋	市道	4-3435号線	32.15	1973	53	R7	Ⅱ		点検					点検					伸縮装置の目地欠損
上広岡橋	市道	4-3464号線	32.15	1973	53	R6	Ⅱ						点検					点検	床版のひびわれ
榎橋	市道	市道1級51号線	31.95	1974	52	R7	Ⅲ		点検					点検					床版のひびわれ
松下橋	市道	4－3589号線	31.72	1974	52	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
43509-1号橋	市道	4-3509号線	6.42	1959	67	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁、橋台のひびわれ
姥久保橋	市道	4-3617号線	43.42	1979	47	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
43529-1号橋	市道	4-3529号線	7	1958	68	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
43530-1号橋	市道	4-3530号線	8.15	2006	20	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
43606-1号橋	市道	4-3606号線	11.16	1959	67	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁のひびわれ
43614-1号橋	市道	4-3614号線	4	1959	67	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
天王台2号橋	市道	4-4340号線	4.77	1963	63	R7	Ⅱ		点検					点検					主桁の剥離、鉄筋露出
44317-1号橋	市道	4-4317号線	2	1980	46	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
44338-1号橋	市道	4-4316号線	2	1975	51	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
中央3号橋	市道	4-4452号線	54	2005	21	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工のひびわれ、遊離石灰
中央2号橋	市道	4-4092号線	79.18	2005	21	R4	Ⅱ				点検					点検			下部工のひびわれ
44093-2号橋	市道	4-4093号線	49.45	1979	47	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁のひびわれ 下部工のひびわれ
1016-1号橋	市道	1016号線（P）	5.1	1976	50	R7	Ⅱ		点検					点検					頂版のひびわれ
44296-1号橋	市道	4-4296号線	2.4	1960	66	R7	Ⅱ		点検					点検					側壁の鉄筋露出
44324-1号橋	市道	4-4324号線	2	1975	51	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
44328-1号橋	市道	4-4328号線	2	1980	46	R7	Ⅱ		点検					点検					側壁の鉄筋露出
44336-1号橋	市道	4-4336号線	2	1980	46	R7	Ⅱ		点検					点検					側壁の鉄筋露出
44335-1号橋	市道	4-4335号線	2	1980	46	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
44334-1号橋	市道	4-4334号線	2	1980	46	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
2022-1号橋	市道	2022号線	2.4	1978	48	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
平塚橋	市道	5－1015号線	12.1	1975	51	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁の定着部の異常 下部工のひびわれ
東平塚橋	市道	1018号線	14.2	1973	53	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁の定着部の異常
小橋	市道	5－1837号線	15.3	2013	13	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
一本橋	市道	市道1級52号線	15.92	2014	12	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
51344-1号橋	市道	5－1344号線	3	1975	51	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ、鉄筋露出 下部工のひびわれ

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
51379-1号橋	市道	5－1379号線	3.2	1979	47	R5	Ⅱ					点検					点検		下部工のひびわれ、鉄筋露出
1-54-1号橋	市道	市道1級54号線	3.22	1980	46	R5	Ⅱ					点検					点検		下部工の遊離石灰
51364-1号橋	市道	5-1364号線	3.42	1985	41	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ
51497-1号橋	市道	5-1497号線	2	1968	58	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
新井橋	市道	5－1542号線	18.23	1983	43	R4	Ⅱ				点検					点検			横桁のうき
万博橋	市道	市道5-1581号線	3.1	1983	43	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ 下部工のひびわれ
谷津橋	市道	市道5-1578号線	2.75	1983	43	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ 下部工のひびわれ
谷田川大橋	市道	１０２５号線	39.77	1989	37	R3	Ⅱ			点検						点検			下部工のひびわれ、遊離石灰
51757-1号橋	市道	5-1757号線	44.65	2006	20	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
下平塚橋	市道	7-3022号線	19.4	2014	12	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
辻橋	市道	7-3014号線	19	2008	18	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
52100-1号橋	市道	5-2100号線	2.88	1979	47	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁・下部工のひびわれ
手代木橋	市道	5-2159号線	52.17	1980	46	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
1022-1号橋	市道	市道1022号線	6	1984	42	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ、遊離石灰
52287-1号橋	市道	5-2287号線	3.45	1979	47	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
西大沼橋	市道	市道2級34号線	7.8	1977	49	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
西大沼橋(歩道)	市道	市道2級34号線	8.47	1978	48	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
弁才天橋	市道	市道5-2262号線	8.35	1977	49	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
関場橋	市道	市道5-2270号線	8.9	1975	51	R5	Ⅱ					点検					点検		床版遊離石灰 下部工のひびわれ
馬洗場橋	市道	市道5-2272号線	8.85	1973	53	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
西田橋	市道	市道5-2275号線	8.92	1977	49	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ
下橋（56015-1号橋）	市道	市道5-6015号線	3.8	1978	48	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
上松橋	市道	市道2級35号線	4.05	1977	49	R5	Ⅱ					点検					点検		下部工のひびわれ、遊離石灰
上橋	市道	5-2318号線	3.8	1969	57	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52358-1号橋	市道	市道5-2358号線	4.83	1968	58	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
2-35-1号橋	市道	市道2級35号線	2.5	1965	61	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52357-1号橋	市道	市道5-2357号線	4.52	1964	62	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52340-1号橋	市道	市道5-2340号線	2.4	1962	64	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
2-34-1号橋	市道	市道2級34号線	7	1961	65	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
52394-1号橋	市道	市道5-2394号線	6.7	2013	13	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
52370-1号橋	市道	市道5-2370号線	4.82	1965	61	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52396-1号橋	市道	市道5-2396号線	4.03	1981	45	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ
笛花橋	市道	市道5-2385号線	9.84	1976	50	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52414-1号橋	市道	市道5-2414号線	4.52	1968	58	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52416-1号橋	市道	市道5-2416号線	6.95	1961	65	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52437-1号橋	市道	市道5-2437号線	6.41	1975	51	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52440-1号橋	市道	市道5-2440号線	4.53	1976	50	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ
52487-1号線	市道	市道5-2487号線	3.98	1961	65	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52483-2号橋	市道	5－2483号線	5.95	1958	68	R5	Ⅱ					点検					点検		床版のうき
52475-1号橋	市道	5－2475号線	6.33	1965	61	R5	Ⅱ					点検					点検		床版の鉄筋露出 下部工の洗掘
52523-1号橋	市道	5－2523号線	4.54	1968	58	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
御城橋	市道	5-2582号線	49.8	1980	46	R6	Ⅲ						点検					点検・設計	主桁のひびわれ 床版のひびわれ
境橋	市道	5－2586号線	14.51	1979	47	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
寺下橋	市道	5-2622号線	15.61	1979	47	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
花輪橋	市道	5－2563号線	15.8	1979	47	R4	Ⅱ				点検					点検			横桁の鉄筋露出
52623-1号橋	市道	市道5-2623号線	6.61	1961	65	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52725-1号橋	市道	市道5-2725号線	9	1965	61	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ 下部工のひびわれ
56035-1号橋	市道	市道5-6035号線	2.2	1975	51	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52744-1号橋	市道	市道5-2744号線	2.2	1975	51	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52748-1号橋	市道	市道5-2748号線	2.32	1976	50	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
向橋	市道	5－2739号線	19.43	1979	47	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁のひびわれ
梨ノ木橋	市道	5－2750号線	15.99	1979	47	R4	Ⅱ				点検					点検			横桁の鉄筋露出
52770-1号橋	市道	市道5-2770号線	2.46	1971	55	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
下横場橋	市道	市道5-2781号線	12.44	1985	41	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
南部橋	市道	市道1級65号線	12.36	1990	36	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
52843-1号橋	市道	市道5-2843号線	10.5	1964	62	R5	Ⅱ					点検					点検		床版の遊離石灰
52878-1号橋	市道	市道5-2878号線	2.4	1961	65	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ 下部工のひびわれ
52563-1号橋	市道	市道5-2563号線	3.15	1975	51	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ 下部工のひびわれ

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
52743-1号橋	市道	市道5-2743号線	2.25	1995	31	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
常磐橋	市道	5－6023号線	15.69	1987	39	R4	Ⅱ				点検					点検			横桁の鉄筋露出、うき
53031-1号橋	市道	市道5-3031号線	7.5	1964	62	R5	Ⅱ					点検					点検		下部工の洗堀
みどりの筑見橋	市道	市道7-1001号線	27	2014	12	R5	Ⅰ					点検					点検		下部工のひびわれ
陣屋橋	市道	5－3198号線	33.06	1982	44	R4	Ⅱ				点検					点検			アーチリブ部の腐食
揖手橋	市道	1024号線	32.65	1977	49	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁のひびわれ、鉄筋露出 床版のひびわれ
彦橋	市道	5－3245号線	40.15	1973	53	R4	Ⅱ				点検					点検			床版の鉄筋露出
興南橋	市道	5－3531号線	46.82	2007	19	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
2-38-1号橋	市道	市道Ⅱ級38号線	29.3	2014	12	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
1-61-1号橋側道橋	市道	市道Ⅰ級61号線	8	1979	47	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ 下部工の洗掘
53327-1号橋	市道	市道5-3327号線	3	1965	61	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ 下部工の洗掘
53328-1号橋	市道	市道5-3328号線	3	1972	54	R5	Ⅱ					点検					点検		下部工の洗掘
1031-1号橋	市道	市道1031号線	3.4	1961	65	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ 下部工のひびわれ
71229-1号橋	市道	市道7-1229号線	9.5	1961	65	R5	Ⅱ					点検					点検		下部工の遊離石灰
1-64-1号橋	市道	市道5-3365号線	35.2	2014	12	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
西南大橋	市道	1029号線	28.86	1988	38	R4	Ⅱ				点検					点検			横桁のうき
2-42-1号橋	市道	市道Ⅱ級42号線	36.3	2014	12	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
53441-2号橋	市道	市道5-3441号線	23.05	1979	47	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
境松橋	市道	市道2級42号線	24.7	1988	38	R7	Ⅰ		点検					点検					概ね健全である
53469-1号橋	市道	市道5-3469号線	44	2010	16	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
53616-1号橋	市道	市道5-3616号線	44	2010	16	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
狸穴橋	市道	市道5-3312号線	10.5	1978	48	R5	Ⅱ					点検					点検		床版の遊離石灰
電鉄橋	市道	５－３２１４号線	41.08	1994	32	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
神橋	市道	5－4039号線	18.5	1978	48	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
鬼ヶ窪橋	市道	市道２級３０号線	18.46	1978	48	R3	Ⅱ			点検					点検				床版の遊離石灰
高田橋	市道	2023号線	18.6	1992	34	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
面野井橋	市道	5－4790号線	19.7	1978	48	R4	Ⅱ				点検					点検			横桁の鉄筋露出
天神橋	市道	5－4402号線	20.6	1977	49	R6	Ⅱ						点検					点検	床版の鉄筋露出

凡例：　　対策の実施時期を示す。


橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
水堀橋	市道	5－4432号線	20.8	1982	44	R4	Ⅰ				点検					点検		設計	概ね健全である
2-30-1号橋	市道	市道2級30号線	5.4	1972	54	R5	Ⅰ					点検					点検		下部工の鉄筋露出
54084-1号橋	市道	市道5-4084号線	2.7	1970	56	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54338-1号橋	市道	市道5-4338号線	3.1	1961	65	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54344-1号橋	市道	市道5-4344号線	2.9	1970	56	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
前橋	市道	5-4326号線	2.9	1959	67	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
東亜橋	市道	市道２級３１号線	16.96	1986	40	R3	Ⅱ			点検					点検				主桁のひびわれ
54303-1号橋	市道	市道5-4303号線	2.9	1961	65	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54493-1号橋	市道	市道5-4493号線	6.3	1964	62	R5	Ⅱ					点検					点検		床版の遊離石灰 下部工の洗掘
54645-1号橋	市道	市道5-4645号線	7.4	1965	61	R5	Ⅱ					点検					点検		下部工の洗掘
54175-1号橋	市道	市道5-4175号線	5.3	1969	57	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54172-1号橋	市道	市道5-4172号線	5.3	1971	55	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54239-1号橋	市道	市道5-4239号線	5.3	1970	56	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54267-1号橋	市道	市道5-4267号線	5.3	1970	56	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54253-1号橋	市道	市道5-4253号線	2.9	1979	47	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
1-60-1号橋	市道	市道Ｉ級60号線	5.3	1975	51	R5	Ⅱ					点検					点検		下部工の洗掘
1-61-1号橋	市道	市道Ｉ級61号線	5.3	1976	50	R5	Ⅱ					点検					点検		主桁のひびわれ
54240-1号橋	市道	市道5-4240号線	6.3	1973	53	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54510-1号橋	市道	市道5-4510号線	7.4	1981	45	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54511-1号橋	市道	市道5-4511号線	7.4	1978	48	R5	Ⅱ					点検					点検		床版の遊離石灰
54513-1号橋	市道	市道5-4513号線	9.4	1985	41	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54515-1号橋	市道	市道5-4515号線	9.4	1977	49	R5	Ⅱ					点検					点検		床版の遊離石灰
54517-1号橋	市道	市道5-4517号線	9.4	1981	45	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54518-1号橋	市道	市道5-4518号線	9.4	1980	46	R5	Ⅱ					点検					点検		下部工の洗掘
54526-1号橋	市道	市道5-4526号線	9	1975	51	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
54530-1号橋	市道	市道5-4530号線	9.4	1976	50	R5	Ⅱ					点検					点検		下部工の洗掘
54514-2号橋	市道	市道5-4514号線	6	1970	56	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である

凡例：　　対策の実施時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	概算費用(千円)	対策の内容・時期										主な損傷
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
古橋	市道	市道１級66号線	18.6	1975	51	R7	Ⅱ		点検					点検					床版の遊離石灰
大井橋	市道	市道１級７１号線	19.3	2002	24	R3	Ⅰ			点検						点検			概ね健全である
九万坪橋	市道	市道２級４８号線	18	1974	52	R3	Ⅱ			点検					点検				床版の鉄筋露出
房内橋	市道	市道２級４８号線	50.1	1975	51	R7	Ⅱ		点検					点検					床版のひびわれ
中山橋	市道	6－2018号線	21.95	1975	51	R4	Ⅱ				点検					点検			床版の鉄筋露出
若菅橋	市道	6－2033号線	21.64	1975	51	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁の鉄筋露出
わかば橋	市道	6－2206号線	2.44	1965	61	R4	Ⅱ				点検					点検			主桁の鉄筋露出
月読橋	市道	6－1101号線	19.45	1991	35	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
樋の沢橋	市道	6－1102号線	19.5	1993	33	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
上大橋	市道	6－5126号線	52.2	2012	14	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
狸山橋	市道	6－5127号線	51.94	2011	15	R4	Ⅰ				点検					点検			概ね健全である
八千代橋	市道	5－1900号線	37.5	2007	19	R6	Ⅰ						点検					点検	概ね健全である
豊年橋	市道	5－1723号線	21.2	1976	50	R6	Ⅰ						点検					点検	概ね健全である
豊年橋側道橋(下流)	市道	5－1723号線	21.1	2011	15	R6	Ⅱ						点検					点検	下部工のひびわれ
豊年橋側道橋(上流)	市道	5－1723号線	21.2	2011	15	R6	Ⅰ						点検					点検	概ね健全である
53441－1号橋	市道	5－3441号線	39.6	2017	9	R7	Ⅰ							点検					概ね健全である
江戸橋側道橋	市道	市道２級53号線	20	2021	5	R7	Ⅰ							点検					概ね健全である
高須賀第１跨道橋	市道	5－4211号線	39.3	2016	10	R7	Ⅰ							点検					概ね健全である
高須賀第２跨道橋	市道	5－4147号線	38.8	2013	13	R7	Ⅰ							点検					概ね健全である
53287－1号橋	市道	5－3287号線	29.2	2015	11	R7	Ⅰ							点検					概ね健全である
小橋	市道	5－1819号線	19	2003	23	R7	Ⅰ							点検					概ね健全である
清水橋	市道	7－3017号線	20	2007	19	R7	Ⅰ							点検					概ね健全である
11135-1号橋	市道	1－1135号線	12	2022	4	R5	Ⅰ					点検					点検		概ね健全である
下田橋	市道	6－4159号線	25	不明		R5	Ⅱ					点検					点検		下部工のひびわれ
睦橋	市道	3－2661号線	17.2	1992	34	R6	Ⅰ						点検					点検	概ね健全である
凱旋橋	市道	5－1723号線	2.9	1959	67	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
凱旋橋側道橋(下り)	市道	5－1723号線	7.1	1986	40	R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
凱旋橋側道橋(上り)	市道	5－1723号線	7	不明		R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
明石橋	市道	市道１級74号線	3	不明		R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
1-74-1号橋	市道	市道１級74号線	3.2	不明		R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
1-74-1号橋側道橋	市道	市道１級74号線	6	不明		R3	Ⅰ			点検					点検				概ね健全である
高山橋	市道	市道１級62号線	22.4	2022	4											点検			
13629-1号橋	市道	1－3629号線	2.6	不明												点検			
13640-1号橋	市道	1－3640号線	3	不明												点検			
13638-1号橋	市道	1－3638号線	3	不明												点検			
作谷橋	市道	市道１級74号線	3	1967	59	R3	Ⅰ									点検			概ね健全である
作谷橋側道橋	市道	市道１級74号線	4	不明		R3	Ⅰ									点検			概ね健全である

6. 長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する603橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の対症療法型が708億円であるのに対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型は87億円となり、コスト縮減効果は621億円となる。 また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

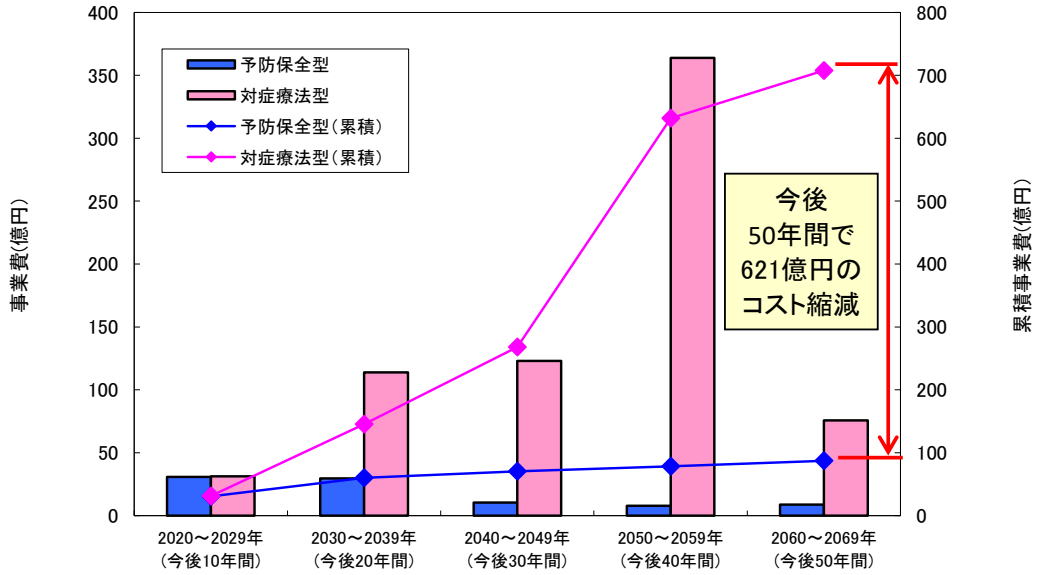

令;

7. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

1)計画策定担当部署

つくば市　建設部　道路整備課　tel:029-883-1111

2)意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

茨城大学 大学院理工学研究科 都市システム工学専攻　　原田　隆郎　　教授
